


ADMINISTRACION DE PROYECTOS

05:00

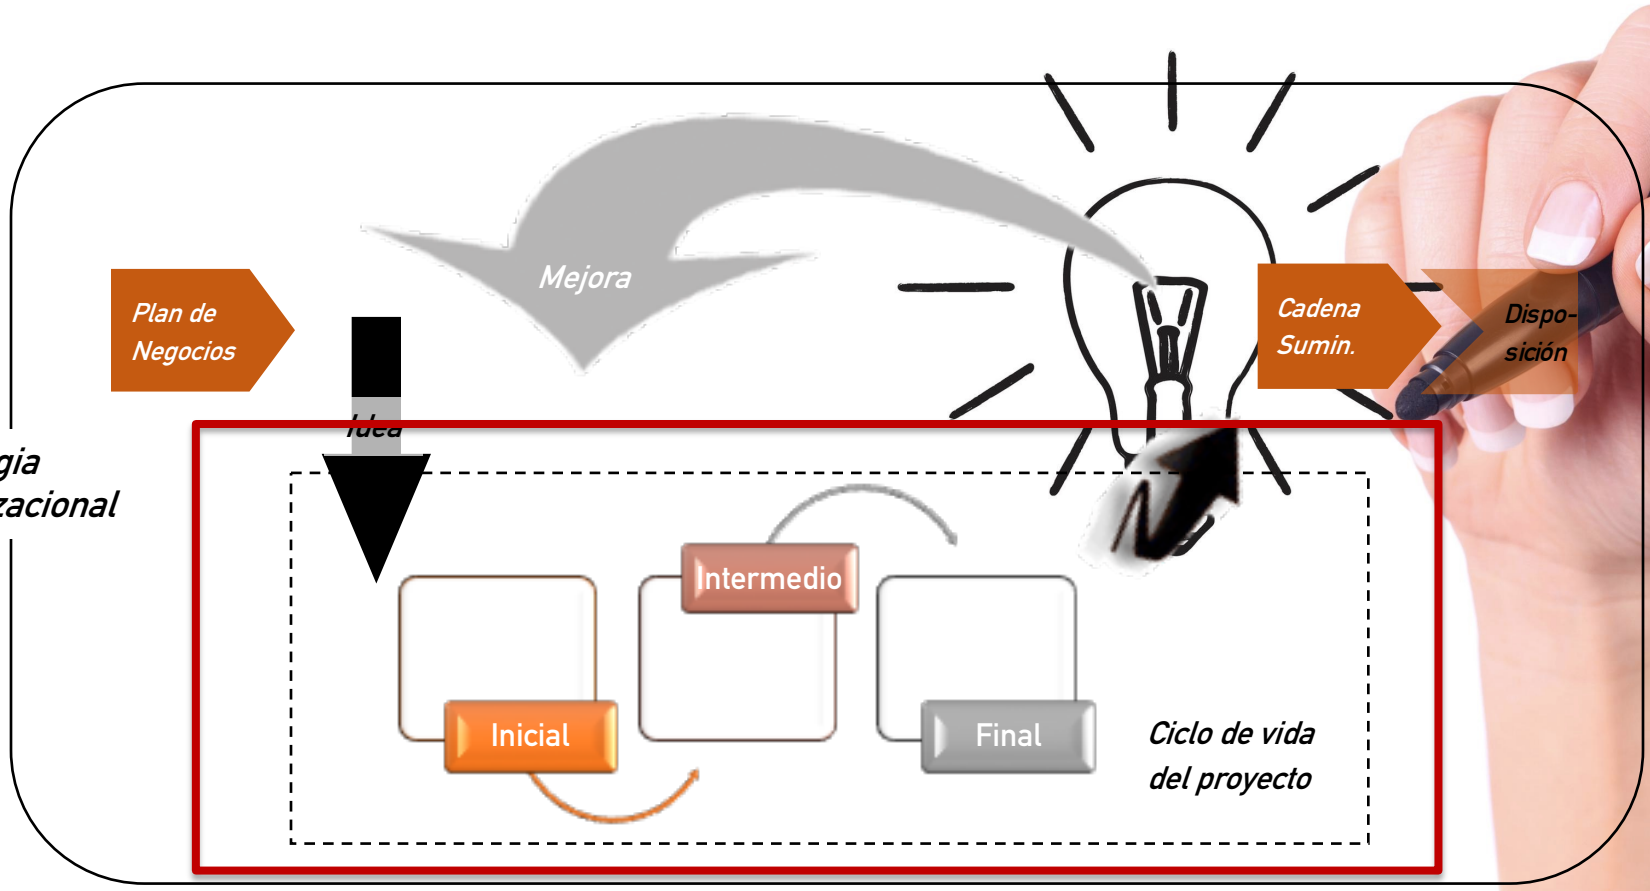

UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA

OBJETIVOS

Comprender la dinámica de Gestión de Proyectos y su aplicación organizacional.

Desarrollar una primera aproximación metodológica que permita incrementar las probabilidades de éxito de los proyectos.

Generar conciencia de la necesidad de desarrollar las prácticas presentadas en el país y la región.


PROJECT MANAGEMENT
PROJECT MANAGER
PROJECT TEAM
PROJECT SPONSOR
PROJECT SPONSOR MIDDLE MANAGEMENT
On-going Projects
Relations
Oportunidades

OPORTUNIDADES EN GESTIÓN DE PROYECTOS

- La revista “The Economist” en conjunto con la firma “Oracle” efectuaron una encuesta a 213 Ejecutivos y Gerentes de Proyecto alrededor del mundo, entre los resultados de dicha encuesta se pueden destacar:
  - Las competencias en Gestión de Proyectos son consideradas cruciales para el negocio (90%), más allá de esto muy pocas empresas llevan una adecuada gestión de proyectos o tienen procesos definidos al respecto (20%).
  - La mitad de los encuestados (53%) consideró que sus empresas realizaban esfuerzos para mejorar sus competencias en Gestión de Proyectos, pero los mismos carecían de foco y consistencia.



OPORTUNIDADES EN GESTIÓN DE PROYECTOS

PROCESSES AND PROJECT MANAGEMENT CAPABILITIES	GLOBAL TOTAL	LATIN AMERICA
Percentage of organizations with a PMO	66%	66%
Percentage of organizations with a PMO that is an EPMO	45%	38%
Percentage of organizations with high alignment of the EPMO to strategy	46%	49%
Percentage of organizations that use standardized project management practices throughout the organization	22%	19%
Percentage of organizations with high project management maturity	42%	33%
Percentage of organizations with high program management maturity	35%	25%
Percentage of projects using hybrid project management approaches	19%	15%

Fuente: PMI's Pulse of the Profession



OPORTUNIDADES EN GESTIÓN DE PROYECTOS

	GLOBAL TOTAL	LATIN AMERICA
PROJECT OUTCOMES		
Percentage of projects meeting goals and business intent	69%	64%
Percentage of projects completed on time	53%	48%
Percentage of projects completed within budget	59%	55%
Percentage of projects with scope creep	35%	30%
Percentage of projects deemed failures	13%	18%
Percentage of project budget lost if a project fails	37%	35%
DOLLARS WASTED		
Dollars wasted	$114M on $1B (11.4%)	$125M on $1B (12.5%)
PRIMARY CAUSE OF PROJECT FAILURE		
Top mention is change in organization priorities	37%	40%

Fuente: PMI's Pulse of the Profession



OPORTUNIDADES EN GESTIÓN DE PROYECTOS

Ninguno de los programas MBA top del mundo incluyen capacitación en PM dentro de sus contenidos centrales

SL. No	School name	Country	Core Project or Program Management	Electives Project or Program
1	London Business School	U.K.	No	Yes
2	University of Pennsylvania: Wharton	U.S.A.	No	No
3	Harvard Business School	U.S.A.	No	No
4	Stanford University GSB	U.S.A.	No	No
5	Insead	France / Singapore	No	No
6	Columbia Business School	U.S.A.	No	No
7	IE Business School	Spain	No	No
8	MIT Sloan School of Management	U.S.A.	No	No
9	University of Chicago: Booth	U.S.A.	No	No
10	Hong Kong UST Business School	China	No	No
11	Iese Business School	Spain	No	No
12	Indian School of Business	India	No	No
13	New York University: Stern	U.S.A.	No	No
14	Dartmouth College: Tuck	U.S.A.	No	No
15	IMD	Switzerland	No	No
16	Yale School of Management	U.S.A.	No	No
17	University of Oxford: Said	U.K.	No	No
18	HEC Paris	France	No	No
19	Esade Business School	Spain	No	No
20	Duke University: Fuqua	U.S.A.	No	No
21	University of Cambridge: Judge	U.K.	No	No
22	Ceibs	China	No	Yes
23	Northwestern University: Kellogg	U.S.A.	No	No
24	Lancaster University Management School	U.K.	No	No
25	Rotterdam School of Management, Erasmus University	Netherlands	No	No

Fuente: FT Business Education Global MBA Ranking



Marco Conceptual

DEFINICIÓN DE PROYECTO

*«Es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único»**



The Eiffel Tower - from April 1888 to May 1889

- *Temporal*
- *Producto, Servicio o Resultado Unico*
- *Elaboración Gradual*

UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA

*Estas definiciones han sido extraídas del Glosario del Project Management Institute, *PMBOK® Guide*

ROL DEL DIRECTOR DE PROYECTOS



Un Director de Proyectos es como un piloto de avión

El Piloto de un avión no es quien lo fabricó y no ostenta su propiedad a nivel titularidad, pero cuando lo pilotea asume el 100% de responsabilidad por todo lo que allí ocurre:

- Debe completar el viaje en el tiempo establecido – Tiempo
- Gastando el minimo combustible - Costo
- Debe llegar a la ciudad de destino – Alcance
- Sin comprometer la integridad de los pasajeros, tripulación o avión – Riesgo
- Evitando turbulencias innecesarias que generen malestar en los pasajeros (mas allá de que esto pueda redundar en ahorros de combustible o menores tiempos de vuelo) – Satisfacción del cliente
- Maximizando la vida útil del aeroplano cumplimentando todas las métricas de operación - Calidad

PROJECT MANAGEMENT OFFICE (PMO)

Coordina comunicación

Entrena y da soporte sobre PM


Desarrolla políticas, metodologías y plantillas para PM



Identifica y desarrolla, metodologías, prácticas y estándares

Recursos compartidos (gerentes de proyecto, sistemas, etc.)

Realiza auditorías de proyecto



El rol de la PMO puede variar de acuerdo a cada estructura organizacional, su función puede ser de soporte, control o dirección. El rol de la PMO no es el mismo que el del Project Manager

PROYECTO Y CADENA DE SUMINISTRO

Proyecto	Cadena de Suministro
Temporales y únicos	Continua y repetitiva
Alcanzar un objetivo y luego concluir	Respaldar el negocio

<u>Ambos tienen en común</u>:

- Realizados por personas
- Restringidos por limitaciones de recursos
- Planificados, ejecutados y controlados
- Realizados para alcanzar objetivos organizacionales o planes estratégicos



UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA



Metodología 1.0

METODOLOGIA PROPUESTA PLAN DE PROYECTO



EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE PROYECTOS

Definición de mecanismos y criterios para EVALUACION y SELECCION de proyectos que conformarán el portfolio


La evaluación implica el análisis de viabilidad del proyecto desde un punto de vista económico-financiero. Suele incluir una descripción de la necesidad del negocio que da origen al proyecto y algún tipo de análisis Costo-Beneficio

Básicamente existen dos tipos de métodos para evaluar un proyecto:

- Beneficio: modelos económicos, de contribución, ponderaciones, etc.
- Matemáticos: programación lineal, algoritmos, etc.

La selección involucra cuestiones más abarcativas, no siempre medibles económicamente, como:

- Nivel de Riesgo asumido
- Efecto del nuevo proyecto sobre el resto del portfolio
- Impacto estratégico
- Estrategias alternativas de financiación para el proyecto
- Etc.





PROJECT CHARTER

Proyecto / Desafío (Mandatorio)	Alcance Preliminar (Mandatorio)	Critical Success Factors (CSF) (Opcional)
PROYECTO: Mapear el mapa de experiencia de los clientes para comprender las instancias de valor. **DESAFIO**:Todo lo que hagamos debe generar valor directo para nuestros clientes.	1. Diseñar metodología; 2. Consturir mapa para cada área; 3. Identificar puntos críticos de contacto.	1. Involucramiento de áreas clave. 2. Especialista externo que guie el proceso.
Objetivos (Mandatorio)	**Entregables (Mandatorio)**	**Principales Stakeholders (Mandatorio)**
Diseñar una herramienta que guie los procesos de los diferentes sectores generando conciencia de su impacto en las satisfacción de nuestro cliente.	1. Mapa de experiencia del cliente. 2. Identificación de instancias clave de relaciión. 3. Identificación de responsables por instancias clave.	1. Board. 2. Directores de Departamento (DID) 3. Marketing 4. Especialista externo
Principales Riesgos (Mandatorio)	**Responsable (Mandatorio)**	**Presupuesto Preliminar (Opcional)**
1. Falta de apoyo de DID. 2. Falta de especialistas. 3. Falta de información.	Principal: Marketing	




INTERESADOS EN EL PROYECTO

"Individuos y organizaciones activamente involucrados en el proyecto, y que pueden influir en sus objetivos"*

Glosario del Project Management Institute, PMBOK® Guide – Fourth Edition, PMI;Inc. 2008

Los interesados en el proyecto son:

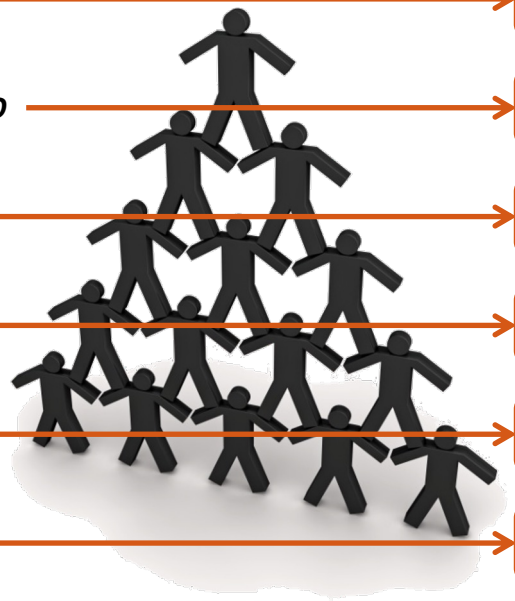

PATROCINADOR	*Proporciona recursos*
DIRECTOR DEL PROYECTO	*Responsable de dirigir*
EQUIPO DEL PROYECTO	*Realiza el trabajo de proyecto*
CLIENTE	*Accede al producto o servicio del proyecto*
USUARIO	*Es el destinatario final del producto o servicio*
OTROS INTERESADOS	*Personas u Organizaciones afectadas en sus intereses por el proyecto y que pueden influir sobre él*

Un interesado puede ocupar más de un rol en el proyecto. Así, por ejemplo, el cliente puede ser la misma persona que el usuario o el patrocinador.
Es importante diferenciar la dinámica que implica el rol que está ejerciendo en cada caso.

UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA

RECOPILAR REQUISITOS

Documentar las necesidades de los interesados para alcanzar los objetivos del proyecto

- Los requerimientos son las necesidades documentadas y cuantificadas de los principales interesados del proyecto.
- La gestión de requisitos incluye la definición y gestión de las expectativas del cliente del proyecto.
- El éxito del proyecto se ve altamente influenciado por el cuidado dedicado a la captura y gestión de requisitos del proyecto y del producto.
- La recopilación de requisitos sirve como guía para los principales esfuerzos de planificación durante la vida del proyecto.
- Requisitos del proyecto pueden ser:
  - Requisitos del negocio
  - Requisitos de entrega
  - Requisitos de gestión de proyectos
  - etc.
- Requisitos del producto pueden ser:
  - Requisitos técnicos
  - Requisitos de performance
  - Requisitos de seguridad
  - etc.

Estas definiciones han sido extraídas del Glosario del Project Management Institute, PMBOK® Guide

HERRAMIENTAS PARA RECOPILAR REQUISITOS

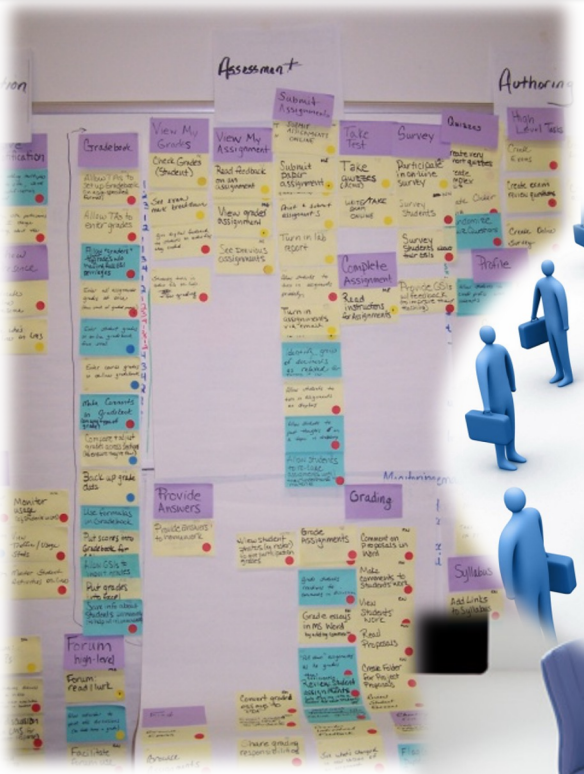


Diagrama de Afinidad

Mapas de Ideas



Técnica Delphi



Tormenta de Ideas


Grupo Nominal



UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA

EJERCICIO INTERESADOS EN EL PROYECTO

- **Usted ha sido designado responsable para la construcción de un Hospital Infantil**
- **Identifique y priorice principales interesados**

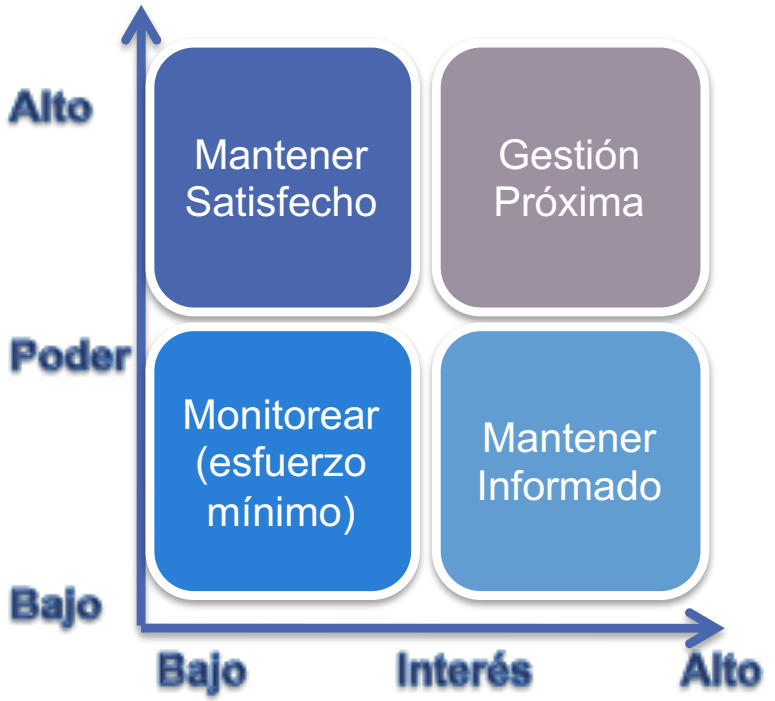

Ejemplo de grilla "Poder / Nivel de Interés"

CREAR LA ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO (EDT)

"Descomposición jerárquica del trabajo del proyecto, necesario para alcanzar sus objetivos y generar los entregables identificados"

La EDT subdivide el trabajo del proyecto en partes más manejables y controlables, el último nivel de la EDT se denomina "Paquete de Trabajo"

Los paquetes de trabajo deben poder:

- Programarse
- Supervisarse
- Controlarse
- Costearse



*Estas definiciones han sido extraídas del Glosario del Project Management Institute, *PMBOK® Guide*

CREAR LA EDT

Existen diversas formas para descomponer el trabajo del proyecto, entre ellas es conveniente tener presentes las siguientes:

- Utilizar el primer nivel de entregables y subproyectos como el primer nivel de descomposición
- Utilizar subproyectos que pueden ser realizados por organizaciones externas al proyecto. En estos casos es el vendedor quien desarrolla esta porción de la EDT
- Utilizar las fases del ciclo de vida del proyecto como el primer nivel de descomposición de la EDT, con los entregables en el segundo nivel.
- Utilizar diferentes aproximaciones para cada rama de la EDT



UTILIZAR EL PRIMER NIVEL DE ENTREGABLES

Gestión de Interesados | **Estructura de desglose de trabajo** | Secuencia-miento | Estimaciones | Armado de cronograma y presupuesto | Gestión de riesgos | Cierre de proyecto











UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA

UTILIZAR EL PRIMER NIVEL DE ENTREGABLES

Utilizar el primer nivel de entregables y subproyectos como el primer nivel de descomposición

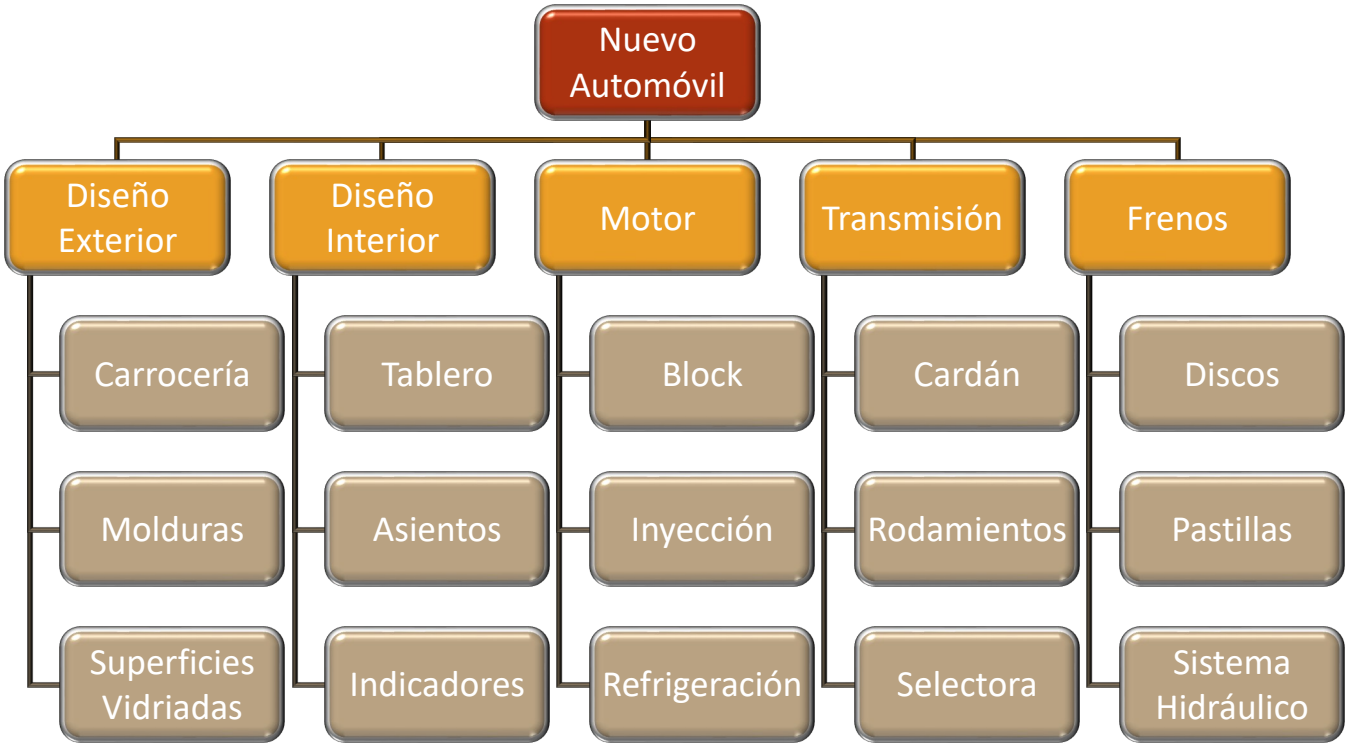

UTILIZAR LAS FASES DEL CICLO DE VIDA DEL PROYECTO

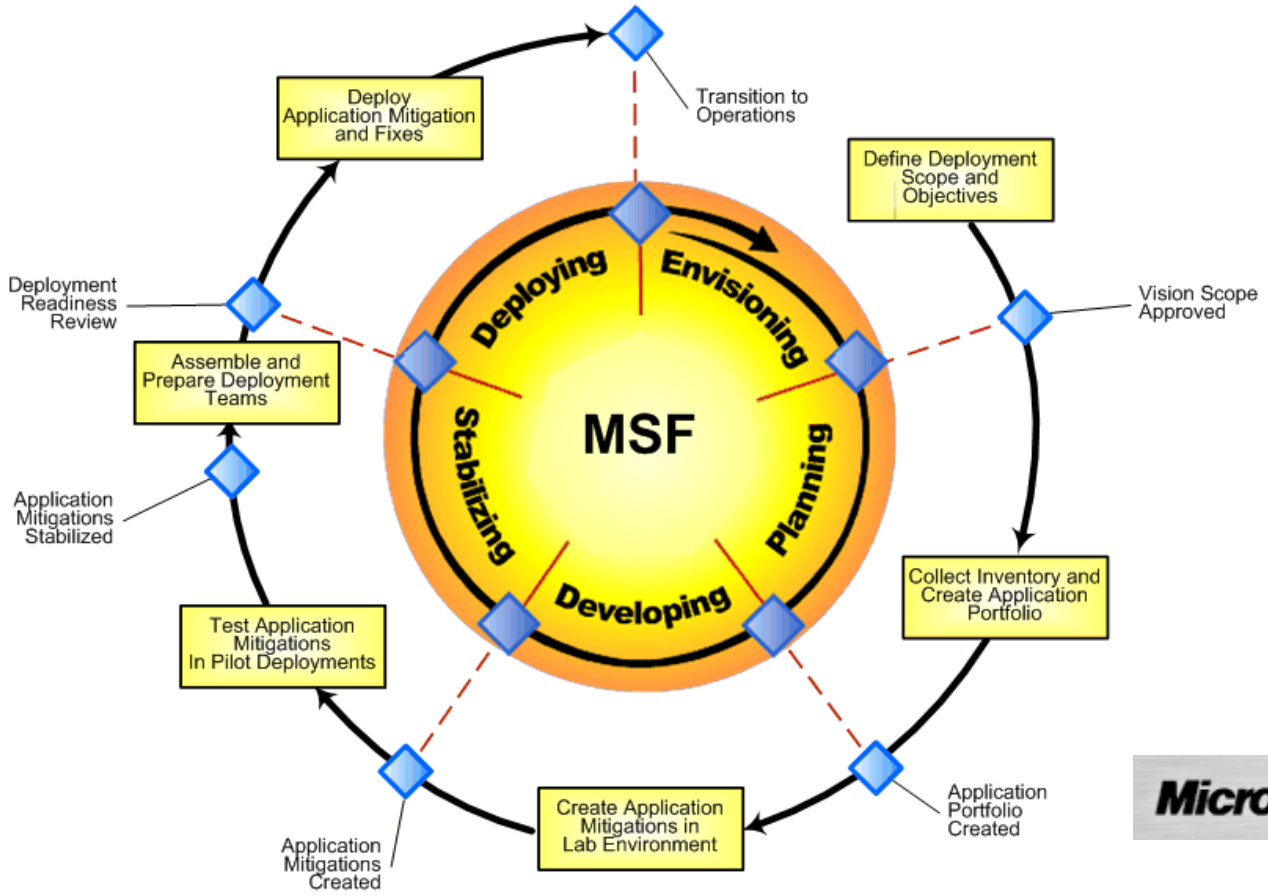


Microsoft TechNet

UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA

UTILIZAR LAS FASES DEL CICLO DE VIDA DEL PROYECTO

Utilizar las fases del ciclo de vida del proyecto como el primer nivel de descomposición de la EDT, con los entregables en el segundo nivel.

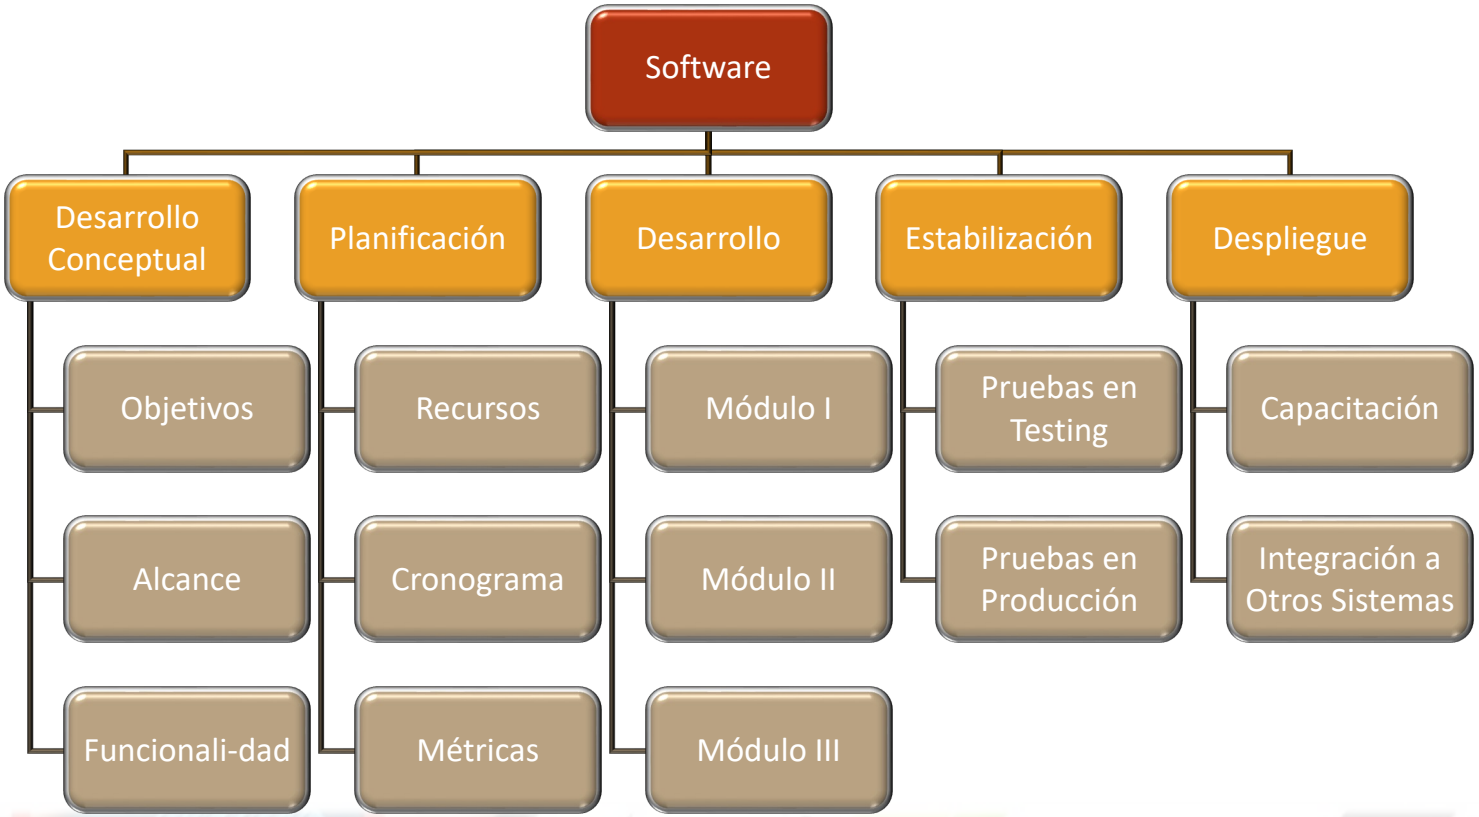

EJERCICIO




UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA

SECUENCIAR TRABAJO


Identificar y documentar las relaciones lógicas entre las actividades del cronograma

- Secuenciar la lista de actividades en la manera en la cual serán ejecutadas
- Las actividades pueden estar ordenadas de forma lógica con relaciones de precedencia, así como adelantos y retrasos
- Su función es respaldar el desarrollo posterior de un cronograma realista y factible
- El establecimiento de la secuencia puede realizarse utilizando un software de gestión de proyectos o mediante técnicas manuales



SECUENCIAR TRABAJO

Método de Diagramación por Precedencia (MDP) – Precedence Diagramming Method (PDM) – Activity on Node (AON)

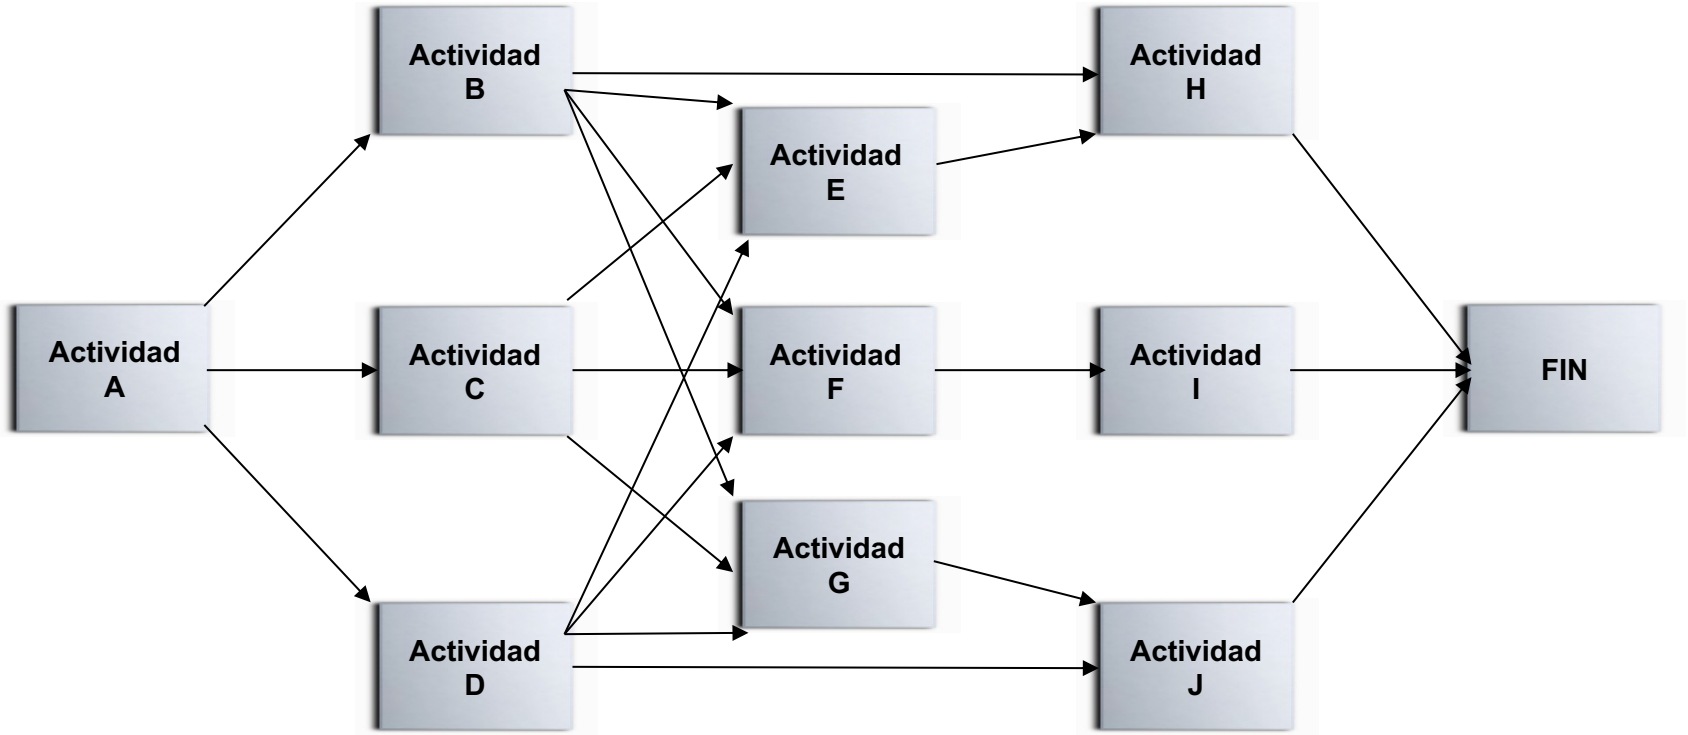

ESTIMACIÓN DE RECURSOS

"Identifica cuáles, cuántos y cuándo estarán disponibles los recursos del proyecto"*

- Personas, equipos, material
- Luego de establecer la secuencia de las actividades se debe determinar el tipo y la cantidad de recursos
- El proceso de estimación de recursos guarda una estrecha relación con el proceso de estimación de costos (el cuál se analizará más adelante)
- Para los recursos estimados se debe prever:
  - Disponibilidad
  - Capacidad de producción
  - Necesidades de administración



*Estas definiciones han sido extraídas del Glosario del Project Management Institute, *PMBOK® Guide*

ESTIMACIÓN DE DURACIÓN

"Implica estimar el número de períodos de trabajo que serán necesarios para completar las actividades del cronograma"*

Utiliza información sobre:

- Alcance de trabajo
- Tipo de recursos necesarios
- Cantidad de recursos y su disponibilidad
- Calendarios de recursos



El proceso requiere:

- Estimaciones de cantidad de esfuerzo necesario
- Estimaciones de cantidad de recursos a ser aplicados
- Determinación de cantidad de períodos laborales necesarios
- Documentación de datos y supuestos de respaldo

Esfuerzo es la cantidad de unidades de trabajo necesarias para terminar una actividad (generalmente se expresa como horas, días o semanas de trabajo del personal)

UNIVERSIDAD DEL CEMA UCEMA

*Estas definiciones han sido extraídas del Glosario del Project Management Institute, *PMBOK*®

ESTIMACIÓN DE COSTOS

"Implica calcular una aproximación del costo de los recursos necesarios para completar cada actividad del cronograma."*

- En el cálculo se deben considerar las posibles causas de variación, incluyendo los riesgos
- Se deben contemplar distintas alternativas, como por ejemplo la decisión de inversión en diseño en etapas tempranas o en trabajo en etapas de ejecución
- Las estimaciones generalmente se expresan en moneda corriente (dólares, euros, pesos, etc). También se pueden expresar en otras unidades como horas hombre junto con sus estimaciones de costo a fin de facilitar el control de gestión
- Si la situación lo amerita las estimaciones deben incluir inflación

*Estas definiciones han sido extraídas del Glosario del Project Management Institute, *PMBOK® Guide*

MECANISMOS DE ESTIMACIÓN DE DURACIÓN Y COSTOS

1.Estimación por Analogía

Utiliza la duración real de una actividad previa similar como base para la estimación futura. Se utiliza:


- En fases tempranas, cuando no existe mucha información disponible
- Existe buena información histórica
- La similitud entre actividades es grande y el equipo del proyecto es más experimentado

2.Estimación Paramétrica

Utiliza un ratio específico y lo multiplica por la cantidad de trabajo a realizar. Por ejemplo, las horas de trabajo necesarias para efectuar la instalación de un cableado pueden determinarse multiplicando la cantidad de metros a cablear por el tiempo necesario para cablear un metro.

Estos ratios específicos pueden ser obtenidos mediante información histórica, mediante publicaciones específicas o cualquier otro medio.

- Duración: lapso de tiempo de trabajo entre el comienzo y la finalización de una actividad





MECANISMOS DE ESTIMACIÓN DE DURACIÓN Y COSTOS

2.Estimación Paramétrica (Cont.)

- Trabajo: es la cantidad de esfuerzo, medido en unidades de tiempo, que un recurso necesita para completar una actividad
- Unidades de Recursos: es cuánto del tiempo disponible del recurso, de acuerdo al calendario de recursos, se está utilizando en una actividad
- Duración = Trabajo / Unidades de Recurso

3.Estimaciones por tres valores

Duración Esperada= (Pesimista + 4 Probables + Optimista) / 6

- Más probable: teniendo en cuenta los recursos que probablemente serán asignados, su productividad y expectativas realistas
- Optimista: considerando el mejor escenario imaginable en base a lo descripto en la estimación más probable
- Pesimista: basado en el peor escenario posible en base a lo descripto en la estimación más probable

Se puede utilizar cuando hay poca información o cierta experiencia previa. Calcula la desviación estándar, la cual puede dimensionar el grado de incertidumbre


Frecuentemente representa precisión sin exactitud. Genera un rango de estimación.



RESERVAS

Muchas veces se incluyen reservas (o asignaciones para contingencias) en distintas estimaciones de costo de recursos para actividades del cronograma.

- Se utilizan a criterio del Gerente de Proyecto
- Su objetivo es cubrir eventos anticipados pero inciertos (known unknows)
- Forman parte del alcance del proyecto y de la línea de base de costo
- Se deben ir ajustando a lo largo del proyecto, a medida que se profundiza en la gestión de riesgos debería tender a disminuir.
- En el diagrama de red del proyecto se pueden representar como una actividad de duración cero vinculada a las actividades para las cuales se constituyen.
- Por encima de la reserva para contingencia existe una reserva de dirección su uso es autorizado por la dirección y no se encuadra dentro de este análisis. Existe para cubrir eventos no anticipados e inciertos (unknown unknows)






DESARROLLAR EL CRONOGRAMA

Determinar las fechas de inicio y fin planificadas para las actividades del proyecto

El proceso requiere:

- Comprensión del trabajo requerido en el proyecto (enunciado de alcance)
- Actividades definidas (EDT)
- Un orden para la ejecución del trabajo (secuencia de actividades)
- Estimación de recursos necesarios y restricciones
- Estimación de duración de las actividades





DESARROLLO DEL CRONOGRAMA POR CAMINO CRÍTICO

Comienzo Temprano	Duración	Fin Temprano
Actividad A		
Comienzo Tardío	Holgura	Fin Tardío

1. Recorrido hacia delante
2. Recorrido hacia atrás
3. Cálculo de holgura




Fin Temprano = Comienzo Temprano + Duración

Holgura = Fin Tardío – Fin Temprano

DESARROLLO DEL CRONOGRAMA POR CAMINO CRÍTICO SIMPLIFICADO


El objetivo del recorrido hacia delante es responder a la pregunta ¿cuándo es lo más rápido que podría finalizarse el proyecto?






- Datos previamente obtenidos (estimación de duración)
- Primer paso: fijar fecha de inicio temprano del proyecto
- Segundo paso: calcular fechas de inicio y fin tempranos del resto de las actividades

EJERCICIO - DESARROLLO DEL CRONOGRAMA

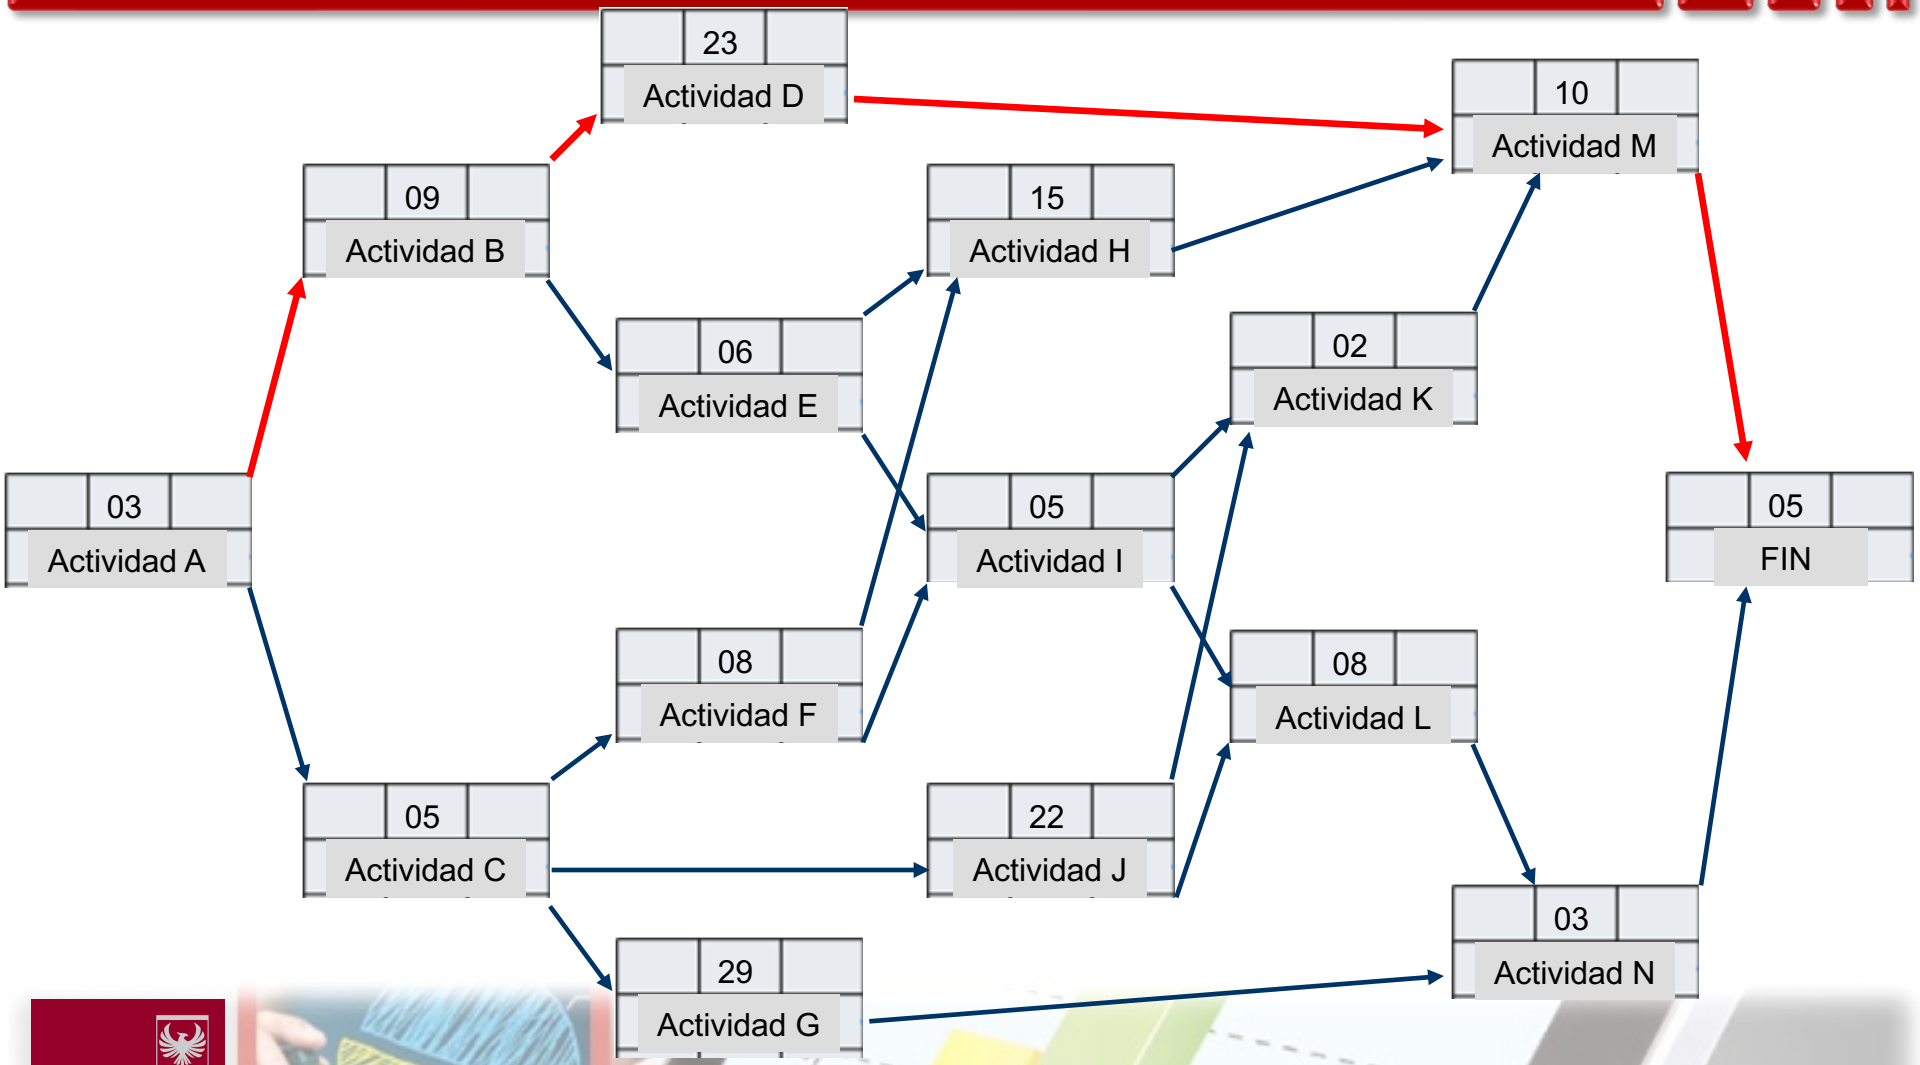


DESARROLLO DEL CRONOGRAMA POR CAMINO CRÍTICO

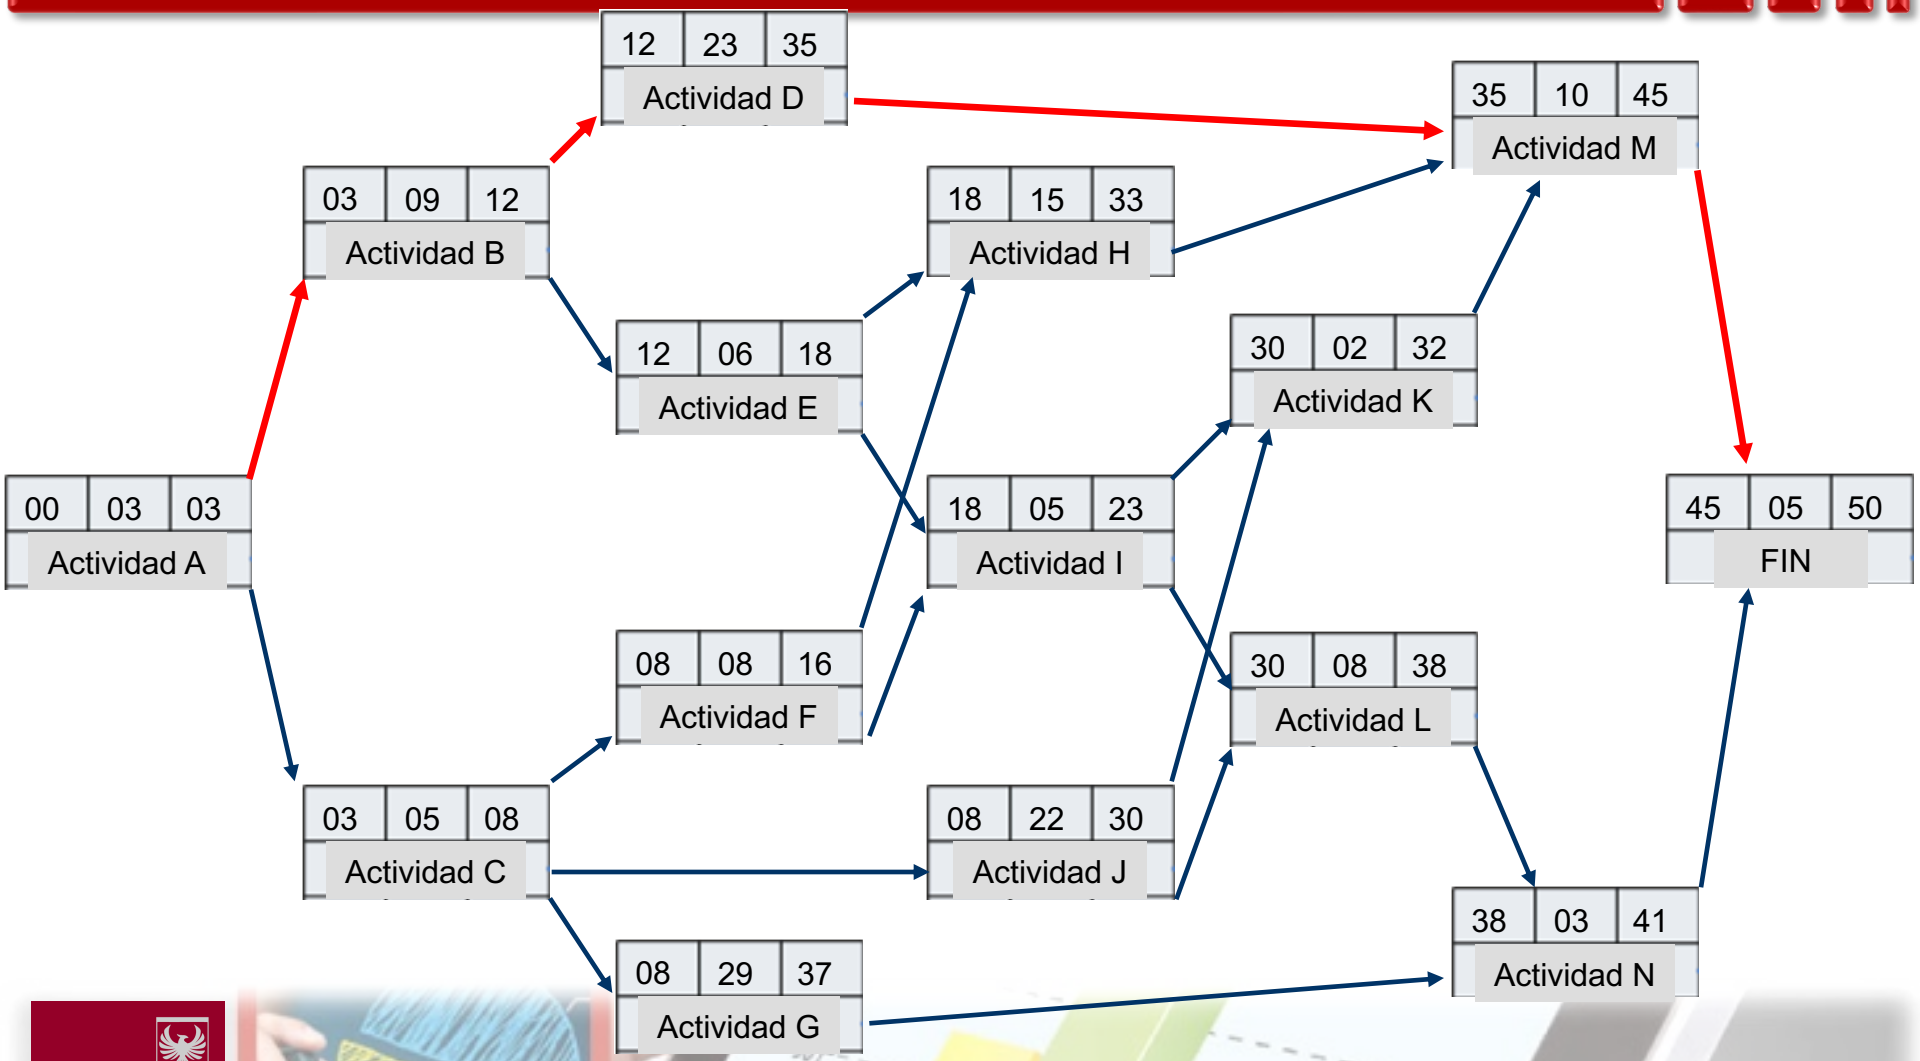

GANTT, OTRA FORMA DE DESARROLLO DE CRONOGRAMA

Bus Unit	Project	%	Start	Finish
Sales	**Mega Project A**	**3**	**13-Mar-00**	**13-Apr-01**
Sales	Project A.1	10	13-Mar-00	16-Jun-00
Sales	Project A.2		11-May-00	28-Jul-00
Sales	Project A.3		10-Jul-00	05-Jan-01
Sales	Project A.4		24-Jul-00	09-Mar-01
Sales	Project A.5	15	13-Mar-00	04-Aug-00
Sales	Project A.6		10-Jul-00	13-Apr-01
Sales	Deliver Mega-Project A		13-Apr-01	13-Apr-01
Finance	Project Alpha		27-Nov-00	28-Sep-01
Finance	Project Beta	10	10-Apr-00	04-Jan-01
Finance	Project Gamma		31-Jul-00	28-Jun-01
	Upgrade Windows 95	100	27-Dec-99	21-Apr-00
IT	**Windows 2000 Project**	**3**	**06-Mar-00**	**07-Dec-01**
IT	Investigate Windows 2000 (R&D)	50	06-Mar-00	28-Apr-00
IT	Windows 2000 Management Strategy (Develop)		24-Apr-00	21-Jul-00
IT	Windows 2000 Management Strategy (Implement)		24-Jul-00	20-Oct-00
IT	Windows 2000 Management Strategy (Test)		28-Aug-00	15-Dec-00
IT	**Windows 2000 Management Strategy (Deploy)**		**18-Dec-00**	**07-Dec-01**
IT	Windows 2000 Upgrade for Desktops		05-Feb-01	03-Oct-01
IT	Windows 2000 Upgrade for Laptops		13-Aug-01	07-Dec-01
IT	Windows 2000 Upgrade for Severs		18-Dec-00	23-Mar-01
IT	Windows 2000 Complete		07-Dec-01	07-Dec-01
Finance	**Mega Project B**	**3**	**21-Feb-00**	**24-Nov-00**
Finance	Project B.1	20	21-Feb-00	07-Apr-00
Finance	Project B.2		10-Apr-00	26-May-00
Finance	Project B.3		10-Apr-00	16-Jun-00
Finance	Project B.4		19-Jun-00	25-Aug-00
Finance	Project B.5		28-Aug-00	24-Nov-00
Finance	Deliver Mega-Project B		24-Nov-00	24-Nov-00
HR	**Payroll System Enhancements**	**28**	**01-Oct-99**	**04-Apr-01**
HR	Task A	80	01-Oct-99	17-Mar-00
HR	Task B	20	31-Jan-00	07-Apr-00
HR	Task C	100	22-Nov-99	14-Jan-00
HR	Task D	10	28-Feb-00	30-Jun-00
HR	**Task E**		**10-Jul-00**	**25-Aug-00**
HR	Task E.1		10-Jul-00	28-Jul-00
HR	Task E.2		31-Jul-00	11-Aug-00
HR	Task E.3		14-Aug-00	25-Aug-00
HR	Task F		25-Sep-00	08-Dec-00
HR	Task G		11-Dec-00	19-Jan-01
HR	Task H		18-Sep-00	04-Apr-01
HR	Upgrade Complete		04-Apr-01	04-Apr-01

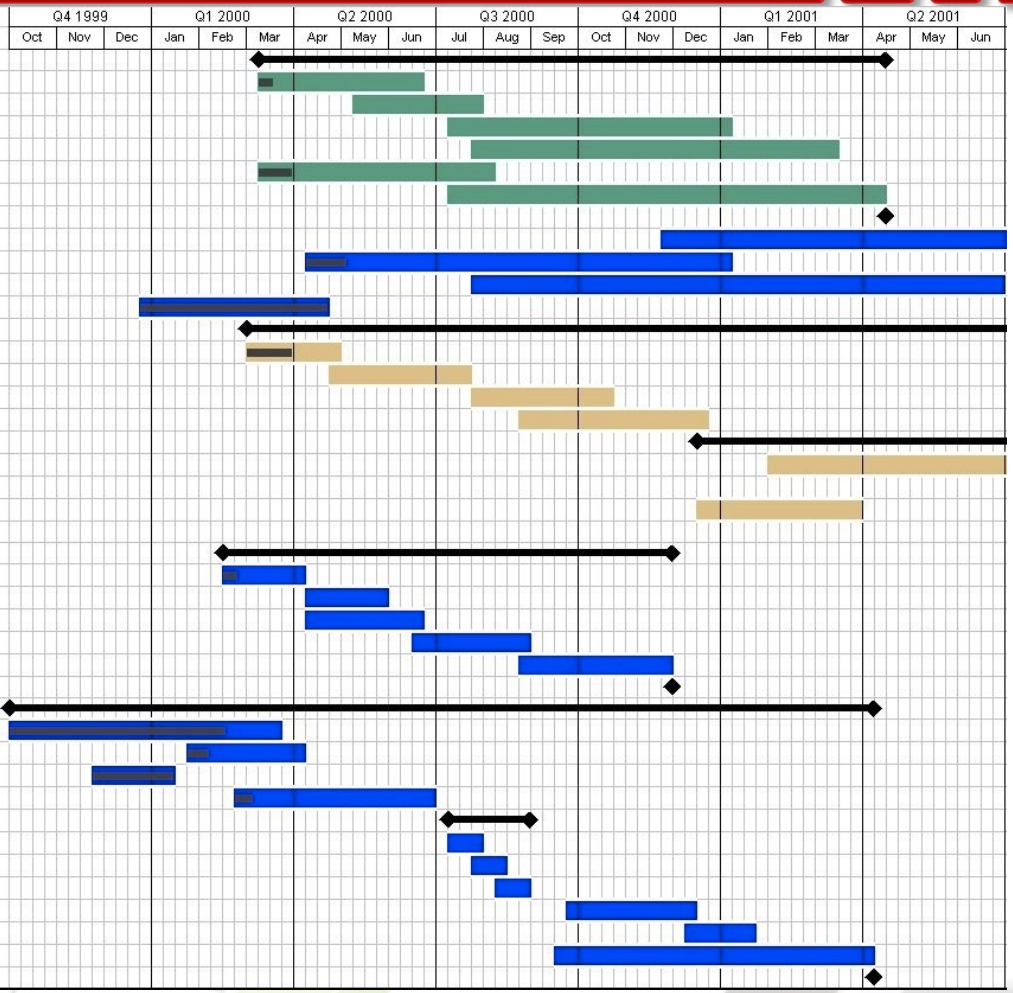

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

"Implica la determinación de los riesgos que pueden afectar al proyecto y la documentación de sus características"*

- Este proceso implica una revisión constante, debido a que los riesgos no son algo estable a medida que el proyecto avanza en su ciclo de vida. Pueden aparecer eventos nuevos o quedar sin vigencia eventos previos.
- Comúnmente, luego de finalizar con la identificación de riesgos, se procede a efectuar el análisis cualitativo de los mismos. Pero en ciertos casos se puede avanzar directamente a su análisis cuantitativo
- En muchos casos la sola identificación de un riesgo sugiere una eventual respuesta para su gestión. Esta información debe documentarse y almacenarse para su posterior utilización en el proceso de planificación de respuestas a los riesgos.







*Estas definiciones han sido extraídas del Glosario del Project Management Institute, *PMBOK® Guide*


IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS



ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

Impacto							
El impacto compromete la supervivencia del proyecto	Alto	5	3,00	4,00	4,00	5,00	5,00
El impacto no puede ser manejado sólo con recursos propios	Moderado	4	3,00	3,00	4,00	4,00	5,00
El impacto es alto pero puede ser manejado con recursos propios	Medio	3	2,00	3,00	3,00	4,00	4,00
El impacto es leve y puede ser manejado con recursos propios	Bajo	2	2,00	2,00	3,00	3,00	4,00
No produce ningún tipo de impacto	Insignificante	1	1,00	2,00	2,00	3,00	3,00
			1	2	3	4	5
			Insignificante	Bajo	Medio	Moderado	Alto
			Extremadamente improbable que suceda	No ha sucedido pero podría suceder	Ha sucedido	Sucede ocasionalmente	Sucede regularmente

Probabilidad de ocurrencia



DEBATE - PLANIFICACIÓN DE LA RESPUESTA A LOS RIESGOS

¿Que acciones puedo tomar ante un riesgo negativo (amenaza)?



PLANIFICACIÓN DE LA RESPUESTA A LOS RIESGOS

1. Estrategias para Riesgos Negativos o Amenazas

- **Evitar:** implica cambiar el Plan de Gestión del Proyecto con el objetivo de eliminar probabilidad o el impacto de un evento de riesgo concreto (por ejemplo ampliando el cronograma, si un evento concreto generaría un desvío de tiempo)
- **Transferir**: trasladar el impacto negativo de una amenaza junto con la propiedad de sus respuesta a un tercero en mejores condiciones para gestionarlo. Casi siempre supone el pago de una prima de riesgo a la parte que lo toma. Las herramientas de transferencia pueden ser bastante diversas e incluyen, el uso de seguros, garantías de cumplimiento, cauciones, etc.
- **Mitigar**: implica reducir la probabilidad y/o el impacto de un evento de riesgo a un nivel aceptable. Por ejemplo adoptar procesos menos complejos, realizar más pruebas o seleccionar un proveedor más estable.
- **Aceptar**: rara vez es posible eliminar todo el riesgo de un proyecto, Esta estrategia indica que el equipo del proyecto ha decidido no adoptar ninguna otra ante un evento de riesgo concreto. La aceptación puede ser pasiva (no hacer nada) o activa (establecer una reserva).

PLANIFICACIÓN DE LA RESPUESTA A LOS RIESGOS

2. Estrategias para Riesgos Positivos u Oportunidades:

- **Explotar:** implica eliminar la incertidumbre respecto a la ocurrencia de un evento positivo para los objetivos del proyecto. Por ejemplo se pueden involucrar más recursos o más talentosos en las actividades asociadas al evento.
- **Compartir**: implica darle propiedad del evento a un tercero en mejores condiciones de concretarlo. Ejemplos de esta estrategia son: asociaciones, uniones temporales de empresas, etc.
- **Mejorar**: esta estrategia modifica el "tamaño" de una oportunidad aumentando su probabilidad y/o impacto. Busca fortalecer la causa de la oportunidad y dirigirse de forma proactiva a las condiciones que la disparan
- **Aceptar**: rara vez es posible gestionar todo el riesgo de un proyecto, Esta estrategia indica que el equipo del proyecto ha decidido no adoptar ninguna otra ante un evento de riesgo concreto. La aceptación puede ser pasiva (no hacer nada) o activa (establecer una reserva).

CIERRE DEL PROYECTO O FASE DEL PROYECTO

"Implica la finalización de todas las tareas comprendidas en el proyecto o en una de sus fases (el proceso se aplica siempre que se finaliza una), la transferencia de los entregables definidos y su verificación."*

Existen 2 procedimientos para establecer las interacciones necesarias a fin de poder ejecutar el cierre del proyecto:

- Cierre administrativo: actividades necesarias para recopilar registros del proyecto, analizar el éxito o fracaso, documentar lecciones aprendidas y archivar toda la información para su uso futuro.
- Cierre de contrato: actividades para cerrar cualquier contrato establecido para el proyecto



UNIVERSIDAD DEL CEMA UCEMA


*Estas definiciones han sido extraídas del Glosario del Project Management Institute, PMBOK® Guide

PROCESOS DE CONTENCIÓN A LA METODOLOGÍA PROPUESTA



UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA


INTEGRACIÓN

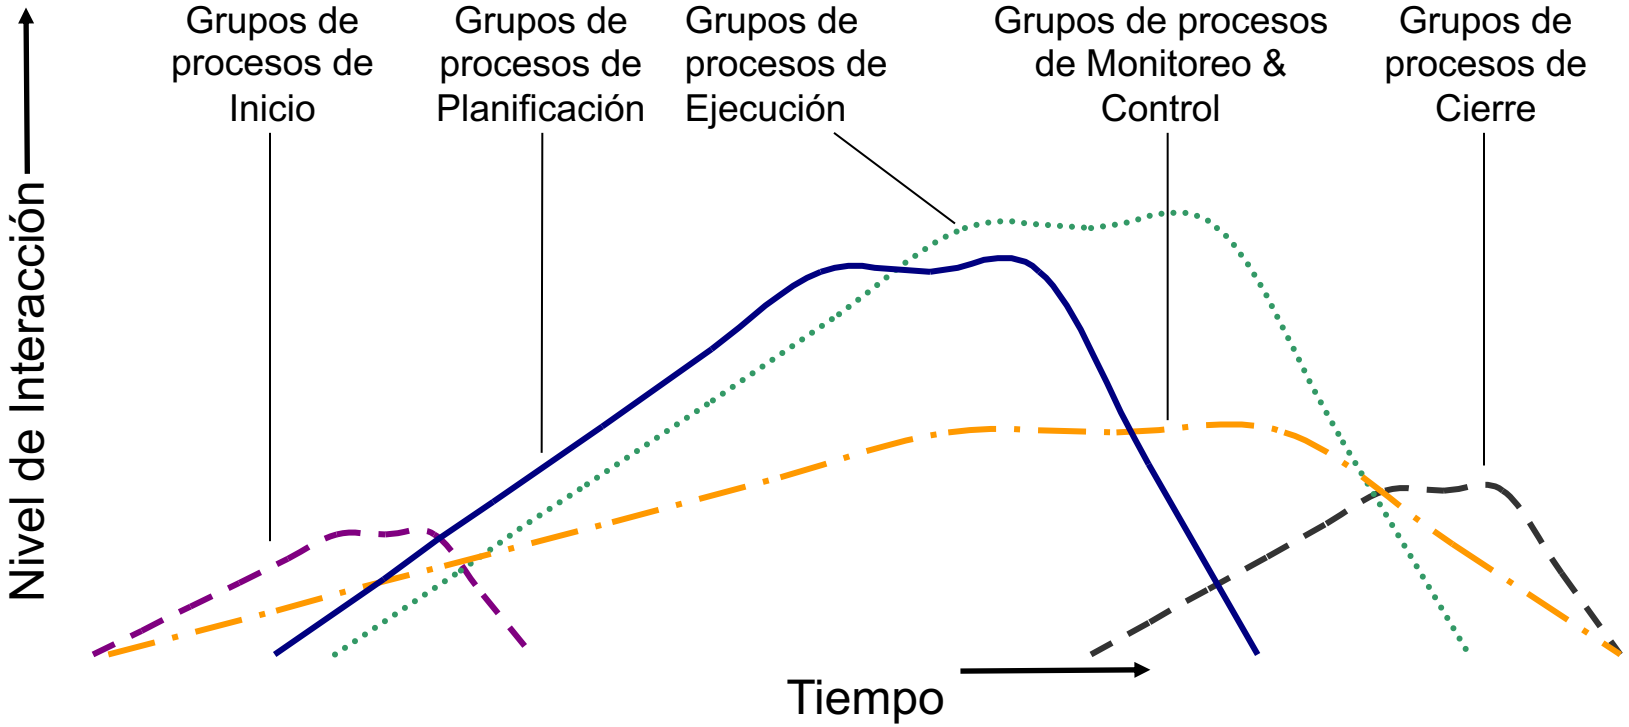

El de integración es un esfuerzo clave en el desempeño del proyecto debido a que su gestión no fluye de manera secuencial y constantemente se superponen situaciones que implican tomar decisiones que en muchos casos son excluyentes.


SEGUIMIENTO Y CONTROL PRINCIPALES MÉTRICAS

Alcance
(Enunciado de Alcance + EDT + Diccionario)




+

Tiempo
(Cronograma)




+

Costo
(Presupuesto)

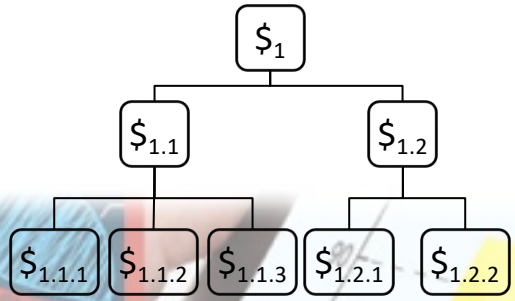

=

Línea Base del Proyecto

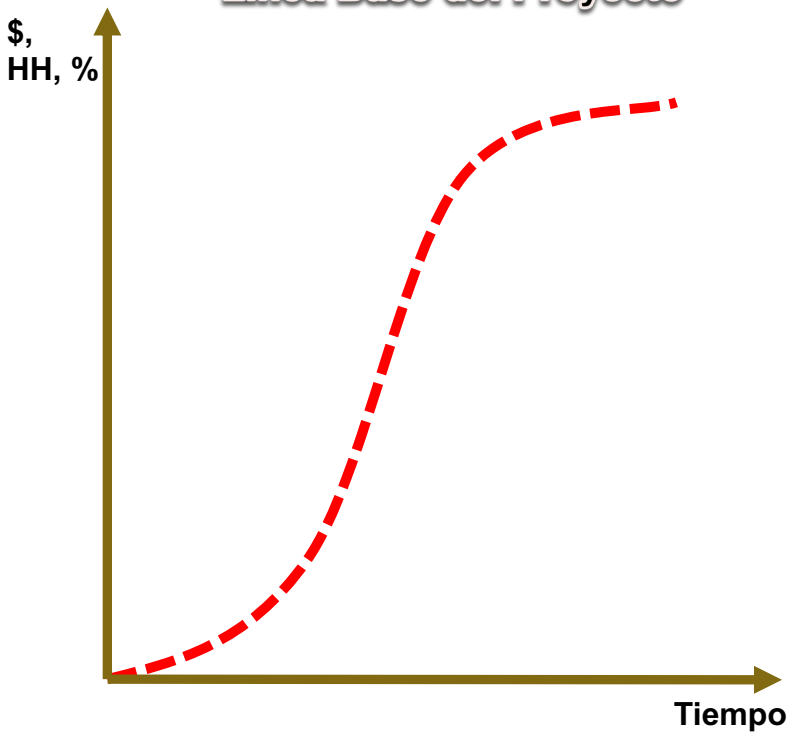

GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

- El equipo del proyecto está compuesto de personas, las cuales tienen roles y responsabilidades asignadas para completar el alcance del proyecto
- Si bien los roles y responsabilidades son asignados, los miembros del equipo del proyecto deben ser involucrados en gran parte de la planificación y toma de decisiones del proyecto
- El involucramiento temprano de los miembros del equipo aumenta su experiencia para la planificación del proyecto y su compromiso
- Si se manejan adecuadamente las diferencias de opinión son positivas para el proyecto
- Cuando las diferencias se transforman en un factor negativo, es responsabilidad del equipo del proyecto su resolución, si el conflicto se intensifica debe intervenir la dirección.
- Los conflictos deben gestionarse lo más tempranamente posible mediante un enfoque directo y constructivo

MADURACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO

Formación (Forming)

Turbulencia (Storming)

Normaliza-ción (Norming)

Pleno Desempeño (Performing)



Asegurar la generación oportuna y adecuada, la recopilación, distribución, almacenamiento, consulta y disposición final de la información de Gestión

- Gestionar los vínculos críticos entre personas e información a fin de garantizar una comunicación exitosa
- ¿Quién necesita información?
- ¿Qué información necesita?
- ¿Cuándo la necesita?
- ¿Cómo se le suministrará?
- ¿Quién la suministrará?

HERRAMIENTA DE TRABAJO

GRILLA DE INTERESADOS Y REQUISITOS

Proyecto...

Interesado	Requisitos	Valoración de Poder	Valoración de Interés	Estrategia Potencial
Nombre y Apellido (Personas Físicas) Nombre Institucional (Personas Jurídicas)	Descripción de principales expectativas y requisitos exigidos al Proyecto por parte del Interesado	Alto/Medio/Bajo - Positivo/Neutro/Negativo	Alto/Medio/Bajo	Mecanismos tendientes a fomentar que se ejerzan influencias positivas y que no se ejerzan influencias negativas

Observaciones:

Se completa primero la columna de interesados. Una vez completada la misma se trabaja por fila detallando para cada interesado los requisitos, la valoración de impacto y la estrategia potencial.

CONTROL DE CAMBIOS | INTERESADOS Y REQUISITOS | ACTIVIDADES Y COSTO | EDT | RIESGOS | COMUNICACIONES

UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA
