


ADMINISTRACION DE PROYECTOS

05:00

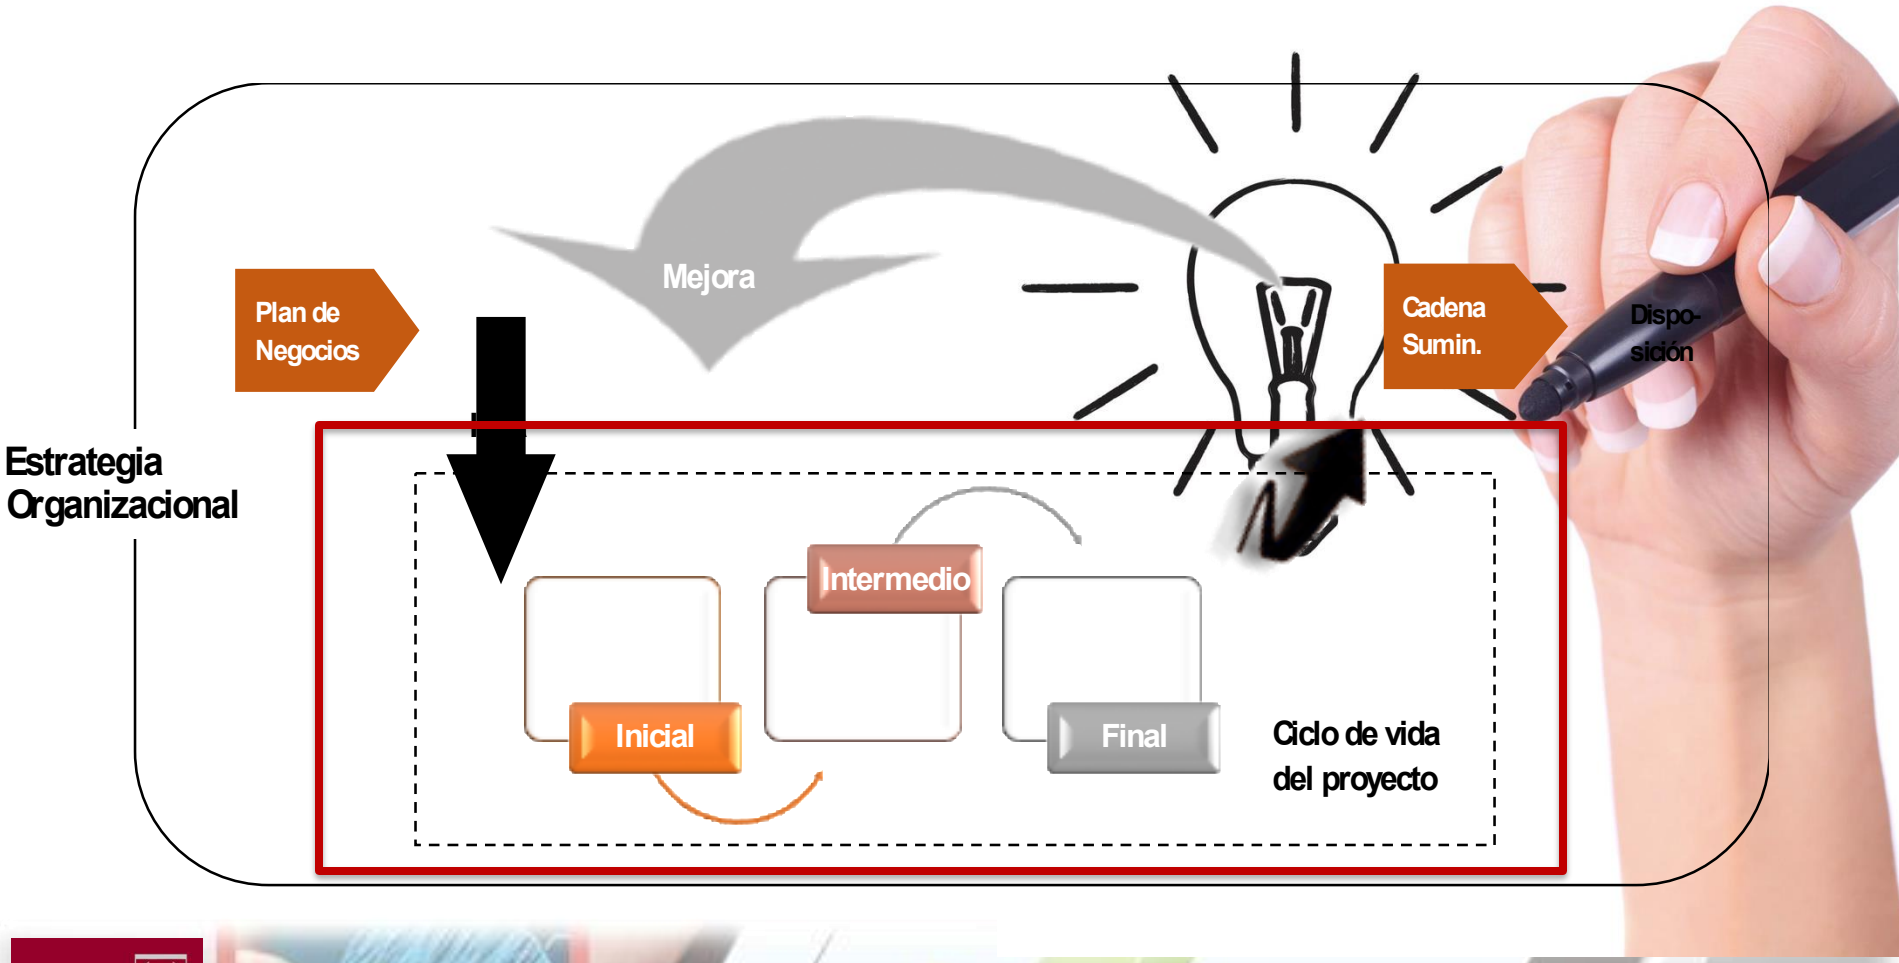

UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA

OBJETIVOS

Comprender la dinámica de Gestión de Proyectos y su aplicación organizacional.

Desarrollar una primera aproximación metodológica que permita incrementar las probabilidades de éxito de los proyectos.

Generar conciencia de la necesidad de desarrollar las prácticas presentadas en el país y la región.


PROJECT MANAGEMENT
PROJECT MANAGER
PROJECT TEAM
PROJECT SPONSOR
MIDDLE MANAGEMENT
On-going Projects
Oportunidades

OPORTUNIDADES EN GESTIÓN DE PROYECTOS

- La revista “The Economist” en conjunto con la firma “Oracle” efectuaron una encuesta a 213 Ejecutivos y Gerentes de Proyecto alrededor del mundo, entre los resultados de dicha encuesta se pueden destacar:
  - Las competencias en Gestión de Proyectos son consideradas cruciales para el negocio (90%), más allá de esto muy pocas empresas llevan una adecuada gestión de proyectos o tienen procesos definidos al respecto (20%).
  - La mitad de los encuestados (53%) consideró que sus empresas realizaban esfuerzos para mejorar sus competencias en Gestión de Proyectos, pero los mismos carecían de foco y consistencia.

The Economist

ORACLE



UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA

OPORTUNIDADES EN GESTIÓN DE PROYECTOS

PROCESSES AND PROJECT MANAGEMENT CAPABILITIES	GLOBAL TOTAL	LATIN AMERICA
Percentage of organizations with a PMO	66%	66%
Percentage of organizations with a PMO that is an EPMO	45%	38%
Percentage of organizations with high alignment of the EPMO to strategy	46%	49%
Percentage of organizations that use standardized project management practices throughout the organization	22%	19%
Percentage of organizations with high project management maturity	42%	33%
Percentage of organizations with high program management maturity	35%	25%
Percentage of projects using hybrid project management approaches	19%	15%

Fuente: PMI's Pulse of the Profession

OPORTUNIDADES EN GESTIÓN DE PROYECTOS

	GLOBAL TOTAL	LATIN AMERICA
PROJECT OUTCOMES		
Percentage of projects meeting goals and business intent	69%	64%
Percentage of projects completed on time	53%	48%
Percentage of projects completed within budget	59%	55%
Percentage of projects with scope creep	35%	30%
Percentage of projects deemed failures	13%	18%
Percentage of project budget lost if a project fails	37%	35%
DOLLARS WASTED		
Dollars wasted	$114M on $1B (11.4%)	$125M on $1B (12.5%)
PRIMARY CAUSE OF PROJECT FAILURE		
Top mention is change in organization priorities	37%	40%

Fuente: PMI's Pulse of the Profession

OPORTUNIDADES EN GESTIÓN DE PROYECTOS

Ninguno de los programas MBA top del mundo incluyen capacitación en PM dentro de sus contenidos centrales

SL. No	School name	Country	Core Project or Program Management	Electives Project or Program
1	London Business School	U.K.	No	Yes
2	University of Pennsylvania: Wharton	U.S.A.	No	No
3	Harvard Business School	U.S.A.	No	No
4	Stanford University GSB	U.S.A.	No	No
5	Insead	France / Singapore	No	No
6	Columbia Business School	U.S.A.	No	No
7	IE Business School	Spain	No	No
8	MIT Sloan School of Management	U.S.A.	No	No
9	University of Chicago: Booth	U.S.A.	No	No
10	Hong Kong UST Business School	China	No	No
11	Iese Business School	Spain	No	No
12	Indian School of Business	India	No	No
13	New York University: Stern	U.S.A.	No	No
14	Dartmouth College: Tuck	U.S.A.	No	No
15	IMD	Switzerland	No	No
16	Yale School of Management	U.S.A.	No	No
17	University of Oxford: Said	U.K.	No	No
18	HEC Paris	France	No	No
19	Esade Business School	Spain	No	No
20	Duke University: Fuqua	U.S.A.	No	No
21	University of Cambridge: Judge	U.K.	No	No
22	Ceibs	China	No	Yes
23	Northwestern University: Kellogg	U.S.A.	No	No
24	Lancaster University Management School	U.K.	No	No
25	Rotterdam School of Management, Erasmus University	Netherlands	No	No

Fuente: FT Business Education Global MBA Ranking



Marco Conceptual

DEFINICIÓN DE PROYECTO

*«Es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único»**



The Eiffel Tower - from April 1888 to May 1889

- *Temporal*
- *Producto, Servicio o Resultado Unico*
- *Elaboración Gradual*

UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA

*Estas definiciones han sido extraídas del Glosario del Project Management Institute, *PMBOK® Guide*

ROL DEL DIRECTOR DE PROYECTOS



Un Director de Proyectos es como un piloto de avión

El Piloto de un avión no es quien lo fabricó y no ostenta su propiedad a nivel titularidad, pero cuando lo pilotea asume el 100% de responsabilidad por todo lo que allí ocurre:

- Debe completar el viaje en el tiempo establecido – Tiempo
- Gastando el minimo combustible - Costo
- Debe llegar a la ciudad de destino – Alcance
- Sin comprometer la integridad de los pasajeros, tripulación o avión – Riesgo
- Evitando turbulencias innecesarias que generen malestar en los pasajeros (mas allá de que esto pueda redundar en ahorros de combustible o menores tiempos de vuelo) – Satisfacción del cliente
- Maximizando la vida útil del aeroplano cumplimentando todas las métricas de operación - Calidad

PROYECTO Y CADENA DE SUMINISTRO



Proyecto

- Temporales y únicos
- Alcanzar un objetivo y luego concluir

Cadena de Suministro

- Continua y repetitiva
- Respaldar el negocio

Ambos tienen en común:

- Realizados por personas
- Restringidos por limitaciones de recursos
- Planificados, ejecutados y controlados
- Realizados para alcanzar objetivos organizacionales o planes estratégicos


PROJECT MANAGEMENT
Relations
PROJECT MANAGER
PROJECT SPONSOR
On-going Projects
PROJECT SPONSOR
MIDDLE MANAGEMENT
PROJECT
TEAM
Metodología 1.0

METODOLOGIA PROPUESTA PLAN DE PROYECTO



Definición de mecanismos y criterios para EVALUACION y SELECCION de proyectos que conformarán el portfolio

La evaluación implica el análisis de viabilidad del proyecto desde un punto de vista económico-financiero. Suele incluir una descripción de la necesidad del negocio que da origen al proyecto y algún tipo de análisis Costo-Beneficio

Básicamente existen dos tipos de métodos para evaluar un proyecto:

- Beneficio: modelos económicos, de contribución, ponderaciones, etc.
- Matemáticos: programación lineal, algoritmos, etc.

La selección involucra cuestiones más abarcativas, no siempre medibles económicamente, como:

- Nivel de Riesgo asumido
- Efecto del nuevo proyecto sobre el resto del portfolio
- Impacto estratégico
- Estrategias alternativas de financiación para el proyecto
- Etc.



PROJECT CHARTER

Proyecto / Desafío (Mandatorio)	Alcance Preliminar (Mandatorio)	Critical Success Factors (CSF) (Opcional)
PROYECTO: Mapear el mapa de experiencia de los clientes para comprender las instancias de valor. **DESAFIO:**Todo lo que hagamos debe generar valor directo para nuestros clientes.	1. Diseñar metodología; 2. Consturir mapa para cada área; 3. Identificar puntos críticos de contacto.	1. Involucramiento de áreas clave. 2. Especialista externo que guie el proceso.
Objetivos (Mandatorio)	**Entregables (Mandatorio)**	**Principales Stakeholders (Mandatorio)**
Diseñar una herramienta que guie los procesos de los diferentes sectores generando conciencia de su impacto en las satisfacción de nuestro cliente.	1. Mapa de experiencia del cliente. 2. Identificación de instancias clave de relaciión. 3. Identificación de responsables por instancias clave.	1. Board. 2. Directores de Departamento (DID) 3. Marketing 4. Especialista externo
Principales Riesgos (Mandatorio)	**Responsable (Mandatorio)**	**Presupuesto Preliminar (Opcional)**
1. Falta de apoyo de DID. 2. Falta de especialistas. 3. Falta de información.	Principal: Marketing	




INTERESADOS EN EL PROYECTO

"Individuos y organizaciones activamente involucrados en el proyecto, y que pueden influir en sus objetivos"*

Glosario del Project Management Institute, PMBOK® Guide – Fourth Edition, PMI;Inc. 2008

Los interesados en el proyecto son:

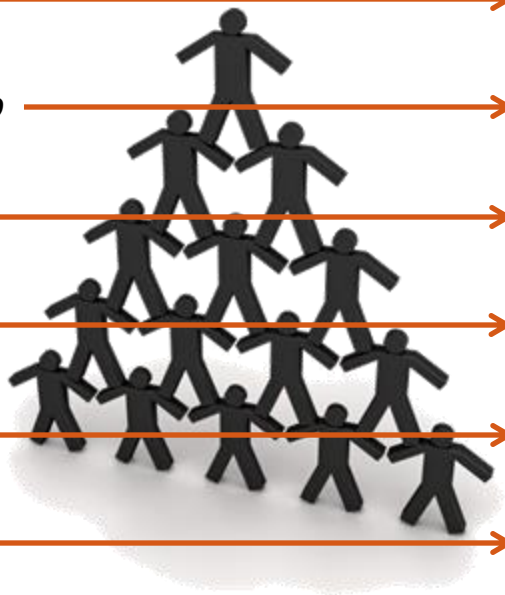

PATROCINADOR	*Proporciona recursos*
DIRECTOR DEL PROYECTO	*Responsable de dirigir*
EQUIPO DEL PROYECTO	*Realiza el trabajo de proyecto*
CLIENTE	*Accede al producto o servicio del proyecto*
USUARIO	*Es el destinatario final del producto o servicio*
OTROS INTERESADOS	*Personas u Organizaciones afectadas en sus intereses por el proyecto y que pueden influir sobre él*

Un interesado puede ocupar más de un rol en el proyecto. Así, por ejemplo, el cliente puede ser la misma persona que el usuario o el patrocinador.
Es importante diferenciar la dinámica que implica el rol que está ejerciendo en cada caso.


HERRAMIENTAS PARA RECOPILAR REQUISITOS



Diagrama de Afinidad

Mapas de Ideas



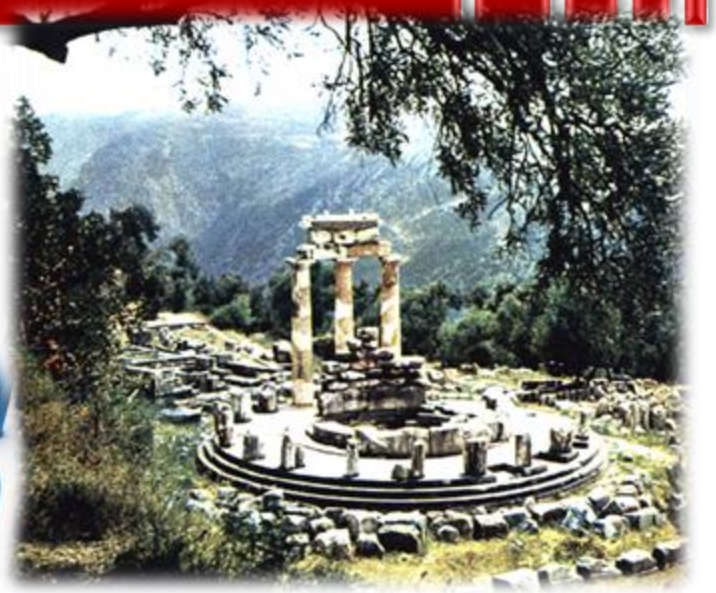

Técnica Delphi


Tormenta de Ideas

Grupo Nominal

UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA

EJERCICIO INTERESADOS EN EL PROYECTO

- **Usted ha sido designado responsable para la construcción de un Hospital Infantil**
- **Identifique y priorice principales interesados**

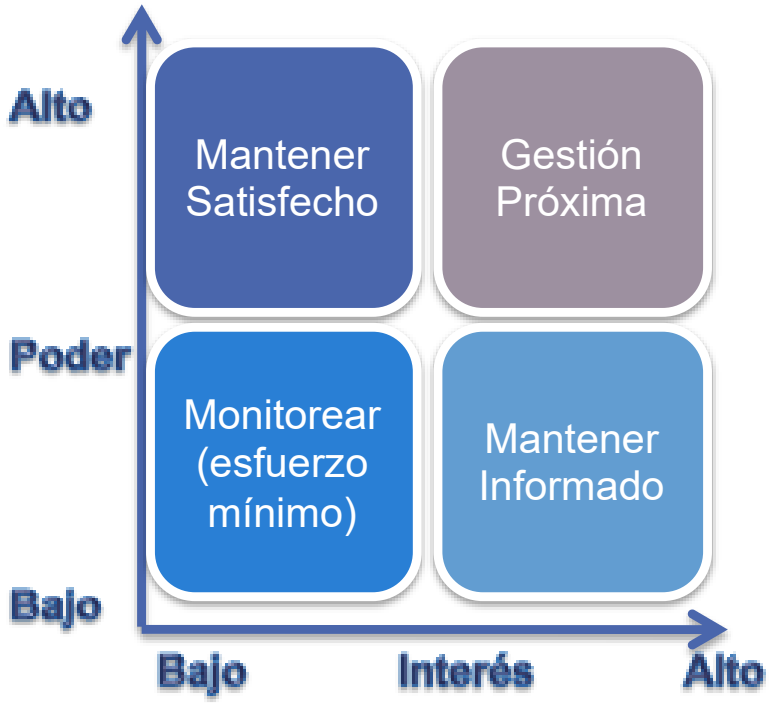

Ejemplo de grilla "Poder / Nivel de Interés"

CREAR LA ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO (EDT)

"Descomposición jerárquica del trabajo del proyecto, necesario para alcanzar sus objetivos y generar los entregables identificados"

La EDT subdivide el trabajo del proyecto en partes más manejables y controlables, el último nivel de la EDT se denomina "Paquete de Trabajo"

Los paquetes de trabajo deben poder:

- Programarse
- Supervisarse
- Controlarse
- Costearse



*Estas definiciones han sido extraídas del Glosario del Project Management Institute, *PMBOK® Guide*

CREAR LA EDT

Existen diversas formas para descomponer el trabajo del proyecto, entre ellas es conveniente tener presentes las siguientes:

- Utilizar el primer nivel de entregables y subproyectos como el primer nivel de descomposición
- Utilizar subproyectos que pueden ser realizados por organizaciones externas al proyecto. En estos casos es el vendedor quien desarrolla esta porción de la EDT
- Utilizar las fases del ciclo de vida del proyecto como el primer nivel de descomposición de la EDT, con los entregables en el segundo nivel.
- Utilizar diferentes aproximaciones para cada rama de la EDT



UTILIZAR EL PRIMER NIVEL DE ENTREGABLES

Gestión de Interesados | **Estructura de desglose de trabajo** | Secuencia-miento | Estimaciones | Armado de cronograma y presupuesto | Gestión de riesgos | Cierre de proyecto











UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA

UTILIZAR EL PRIMER NIVEL DE ENTREGABLES

Utilizar el primer nivel de entregables y subproyectos como el primer nivel de descomposición

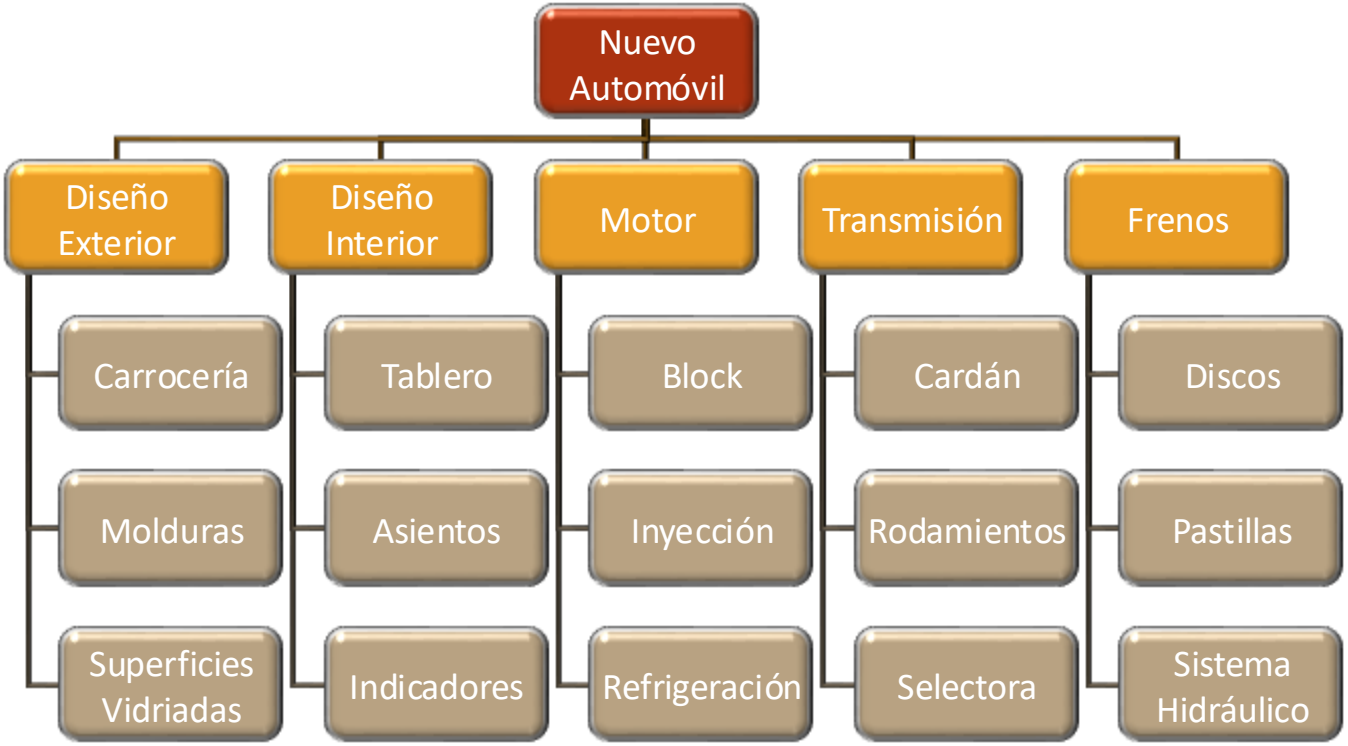

UTILIZAR LAS FASES DEL CICLO DE VIDA DEL PROYECTO

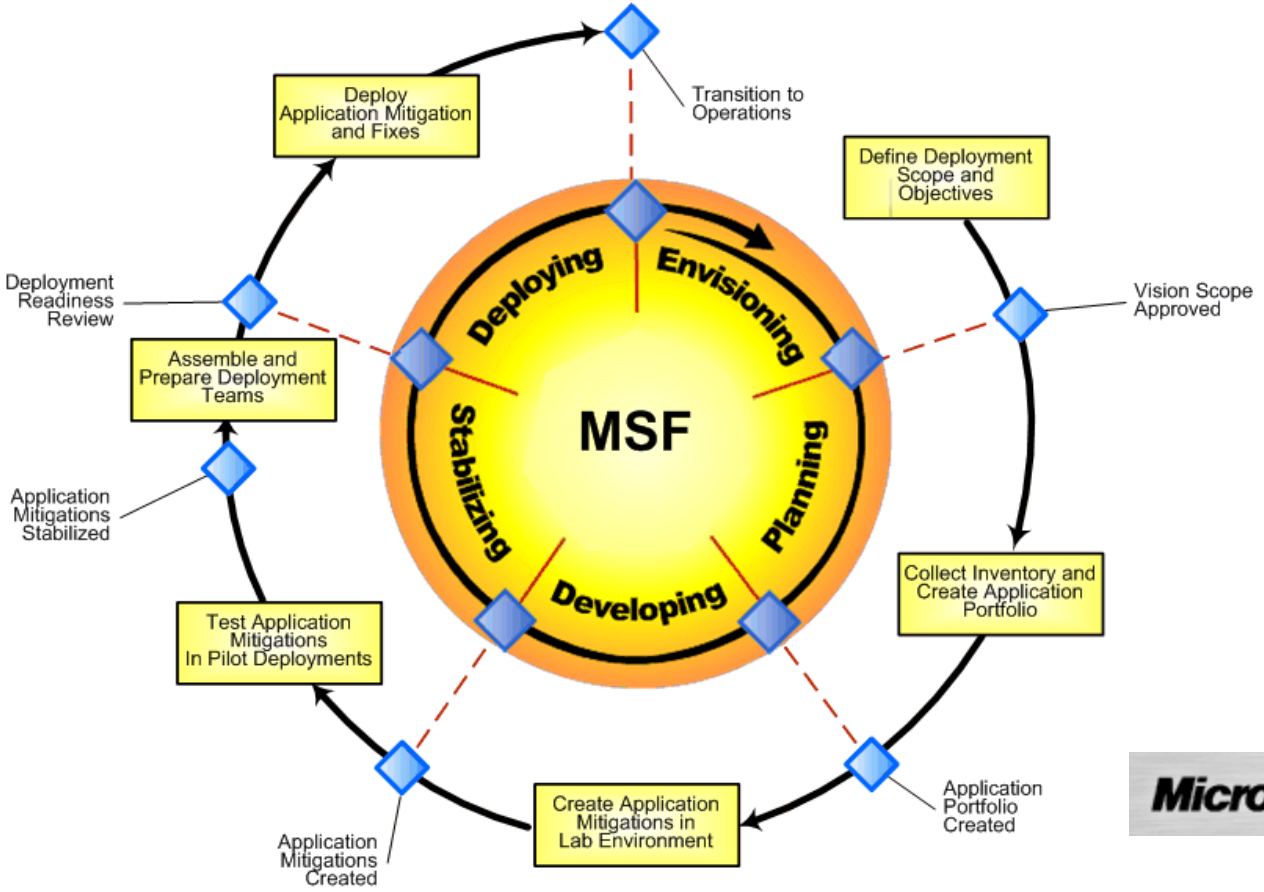


Microsoft TechNet

UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA

UTILIZAR LAS FASES DEL CICLO DE VIDA DEL PROYECTO

Utilizar las fases del ciclo de vida del proyecto como el primer nivel de descomposición de la EDT, con los entregables en el segundo nivel.

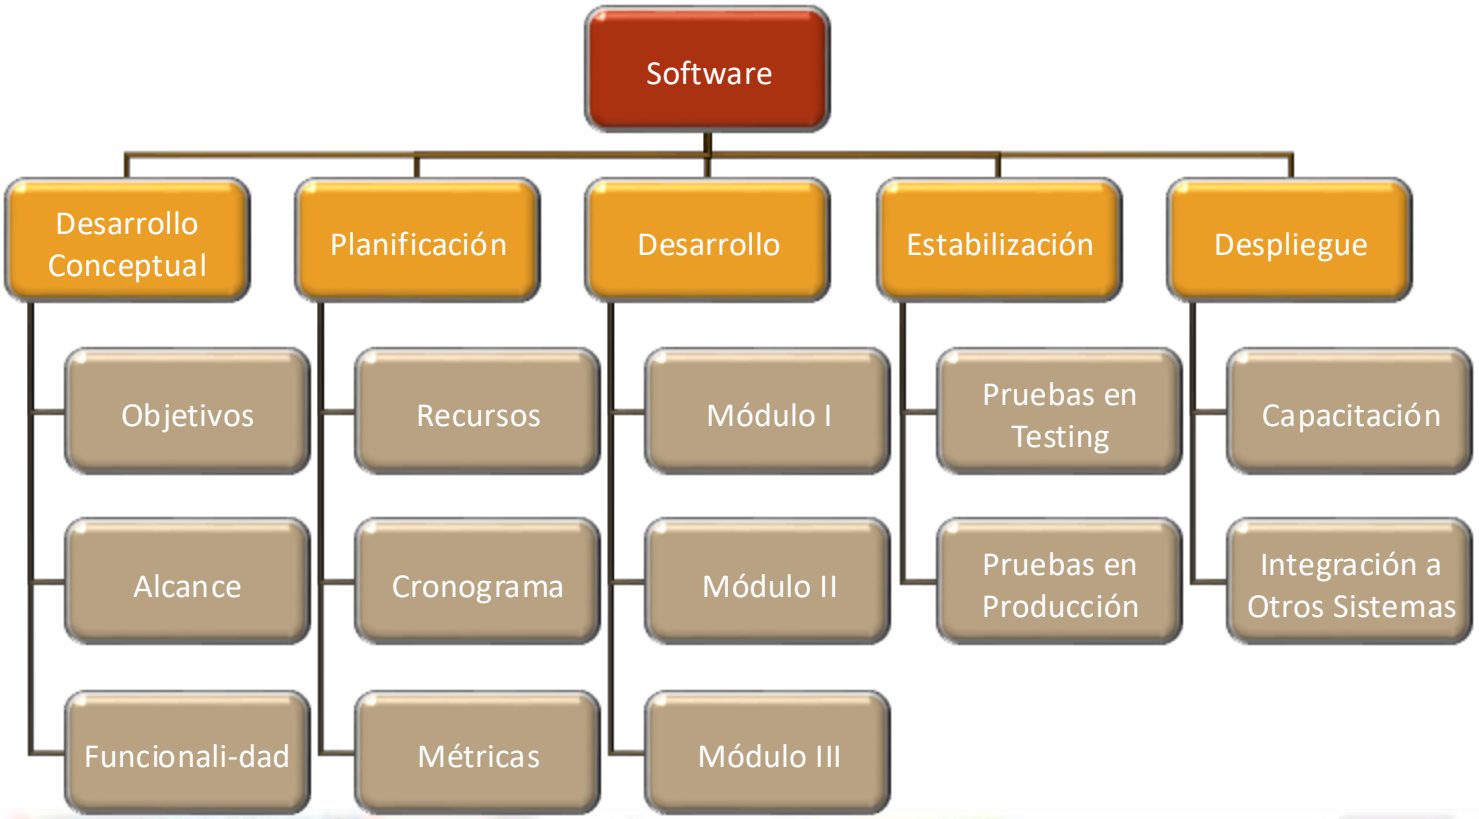

EJERCICIO




UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA

SECUENCIAR TRABAJO


Identificar y documentar las relaciones lógicas entre las actividades del cronograma

- Secuenciar la lista de actividades en la manera en la cual serán ejecutadas
- Las actividades pueden estar ordenadas de forma lógica con relaciones de precedencia, así como adelantos y retrasos
- Su función es respaldar el desarrollo posterior de un cronograma realista y factible
- El establecimiento de la secuencia puede realizarse utilizando un software de gestión de proyectos o mediante técnicas manuales



SECUENCIAR TRABAJO

Método de Diagramación por Precedencia (MDP) – Precedence Diagramming Method (PDM) – Activity on Node (AON)

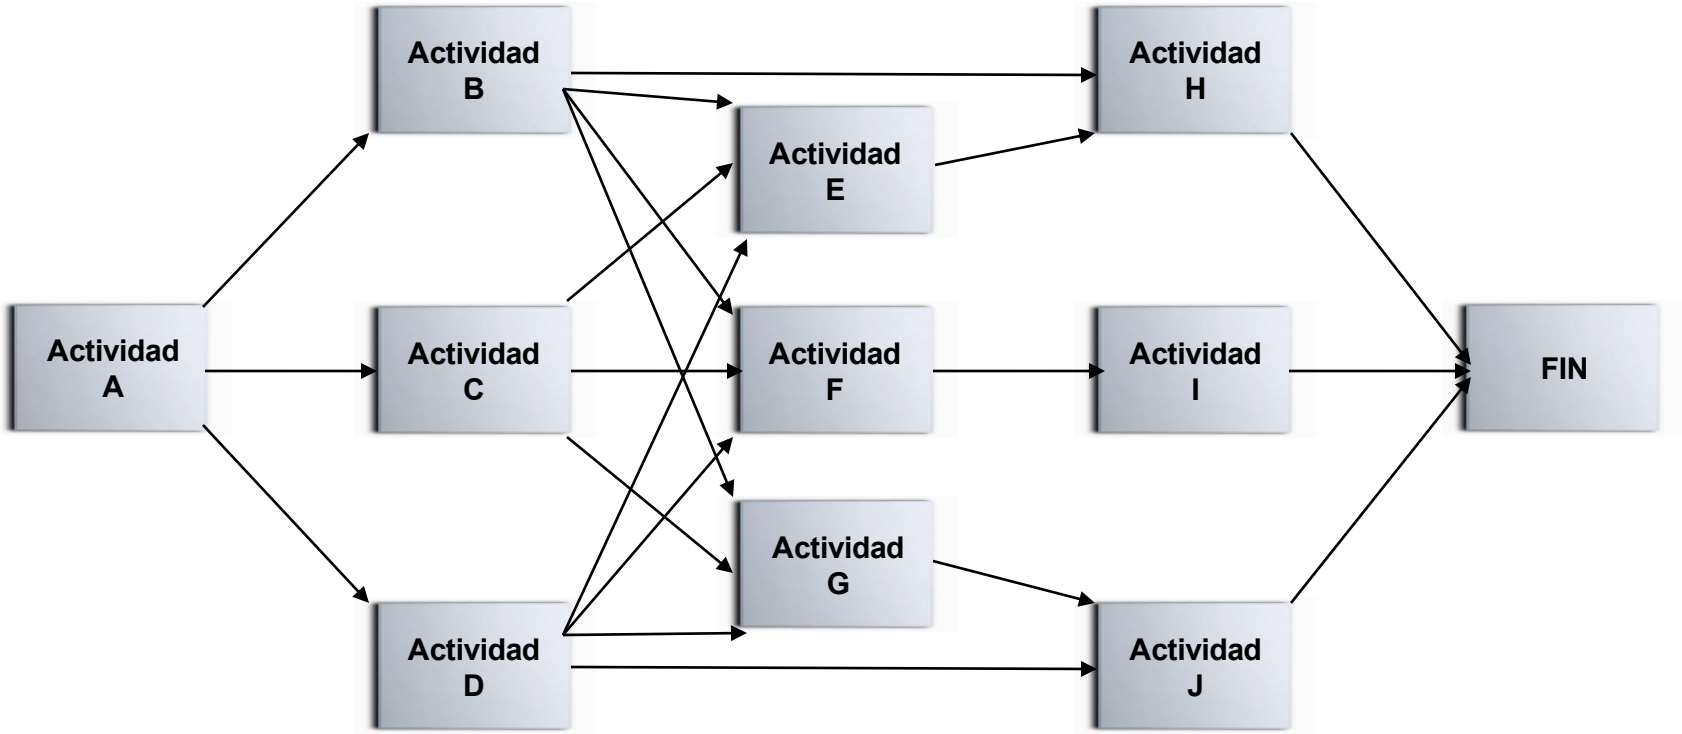

ESTIMACIÓN DE RECURSOS, TIEMPOS Y COSTOS



*Estas definiciones han sido extraídas del Glosario del Project Management Institute, *PMBOK® Guide*

DESARROLLAR EL CRONOGRAMA

Determinar las fechas de inicio y fin planificadas para las actividades del proyecto

El proceso requiere:

- Comprensión del trabajo requerido en el proyecto (enunciado de alcance)
- Actividades definidas (EDT)
- Un orden para la ejecución del trabajo (secuencia de actividades)
- Estimación de recursos necesarios y restricciones
- Estimación de duración de las actividades



DESARROLLO DEL CRONOGRAMA POR CAMINO CRÍTICO

Comienzo Temprano	Duración	Fin Temprano
Actividad A		
Comienzo Tardío	Holgura	Fin Tardío

1. Recorrido hacia delante
2. Recorrido hacia atrás
3. Cálculo de holgura




Fin Temprano = Comienzo Temprano + Duración

Holgura = Fin Tardío – Fin Temprano

DESARROLLO DEL CRONOGRAMA POR CAMINO CRÍTICO SIMPLIFICADO

El objetivo del recorrido hacia delante es responder a la pregunta ¿cuándo es lo más rápido que podría finalizarse el proyecto?






Datos previamente obtenidos (estimación de duración)


Primer paso: fijar fecha de inicio temprano del proyecto

Segundo paso: calcular fechas de inicio y fin tempranos del resto de las actividades

EJERCICIO - DESARROLLO DEL CRONOGRAMA

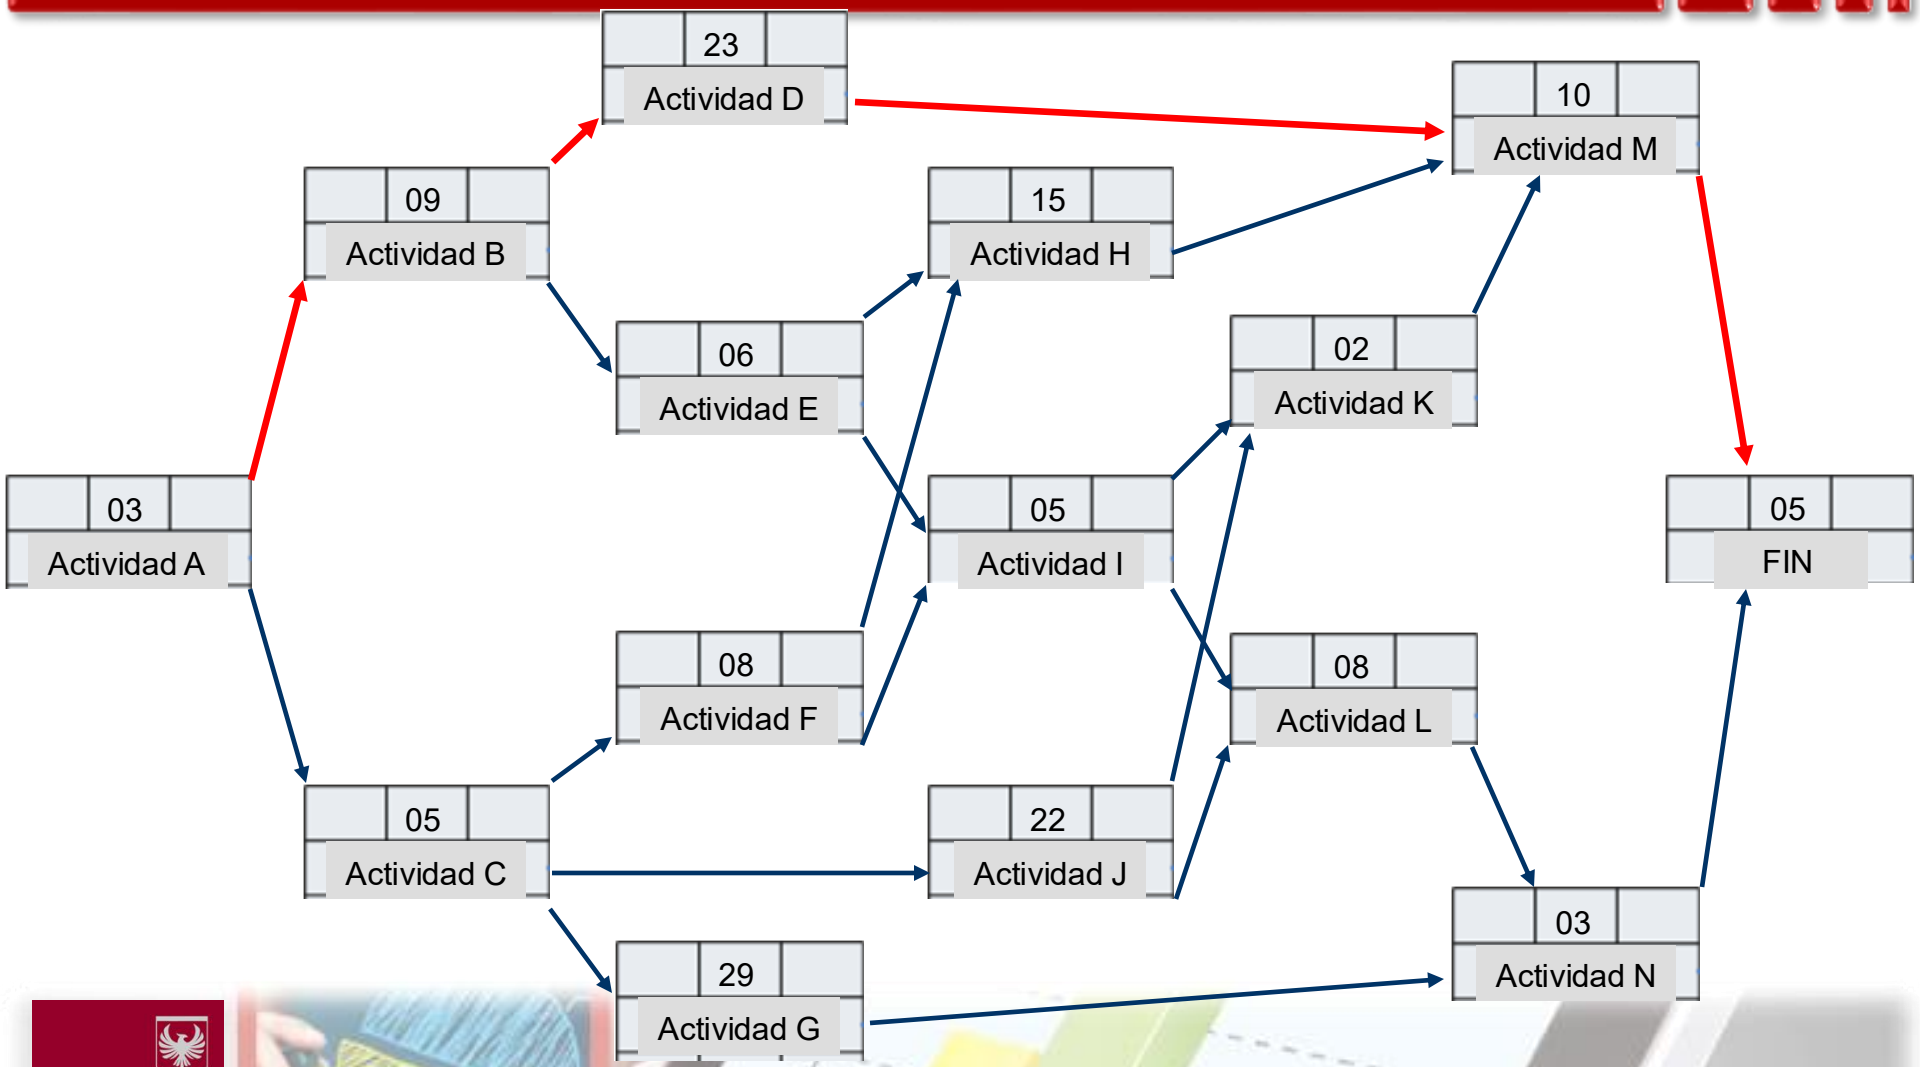


DESARROLLO DEL CRONOGRAMA POR CAMINO CRÍTICO

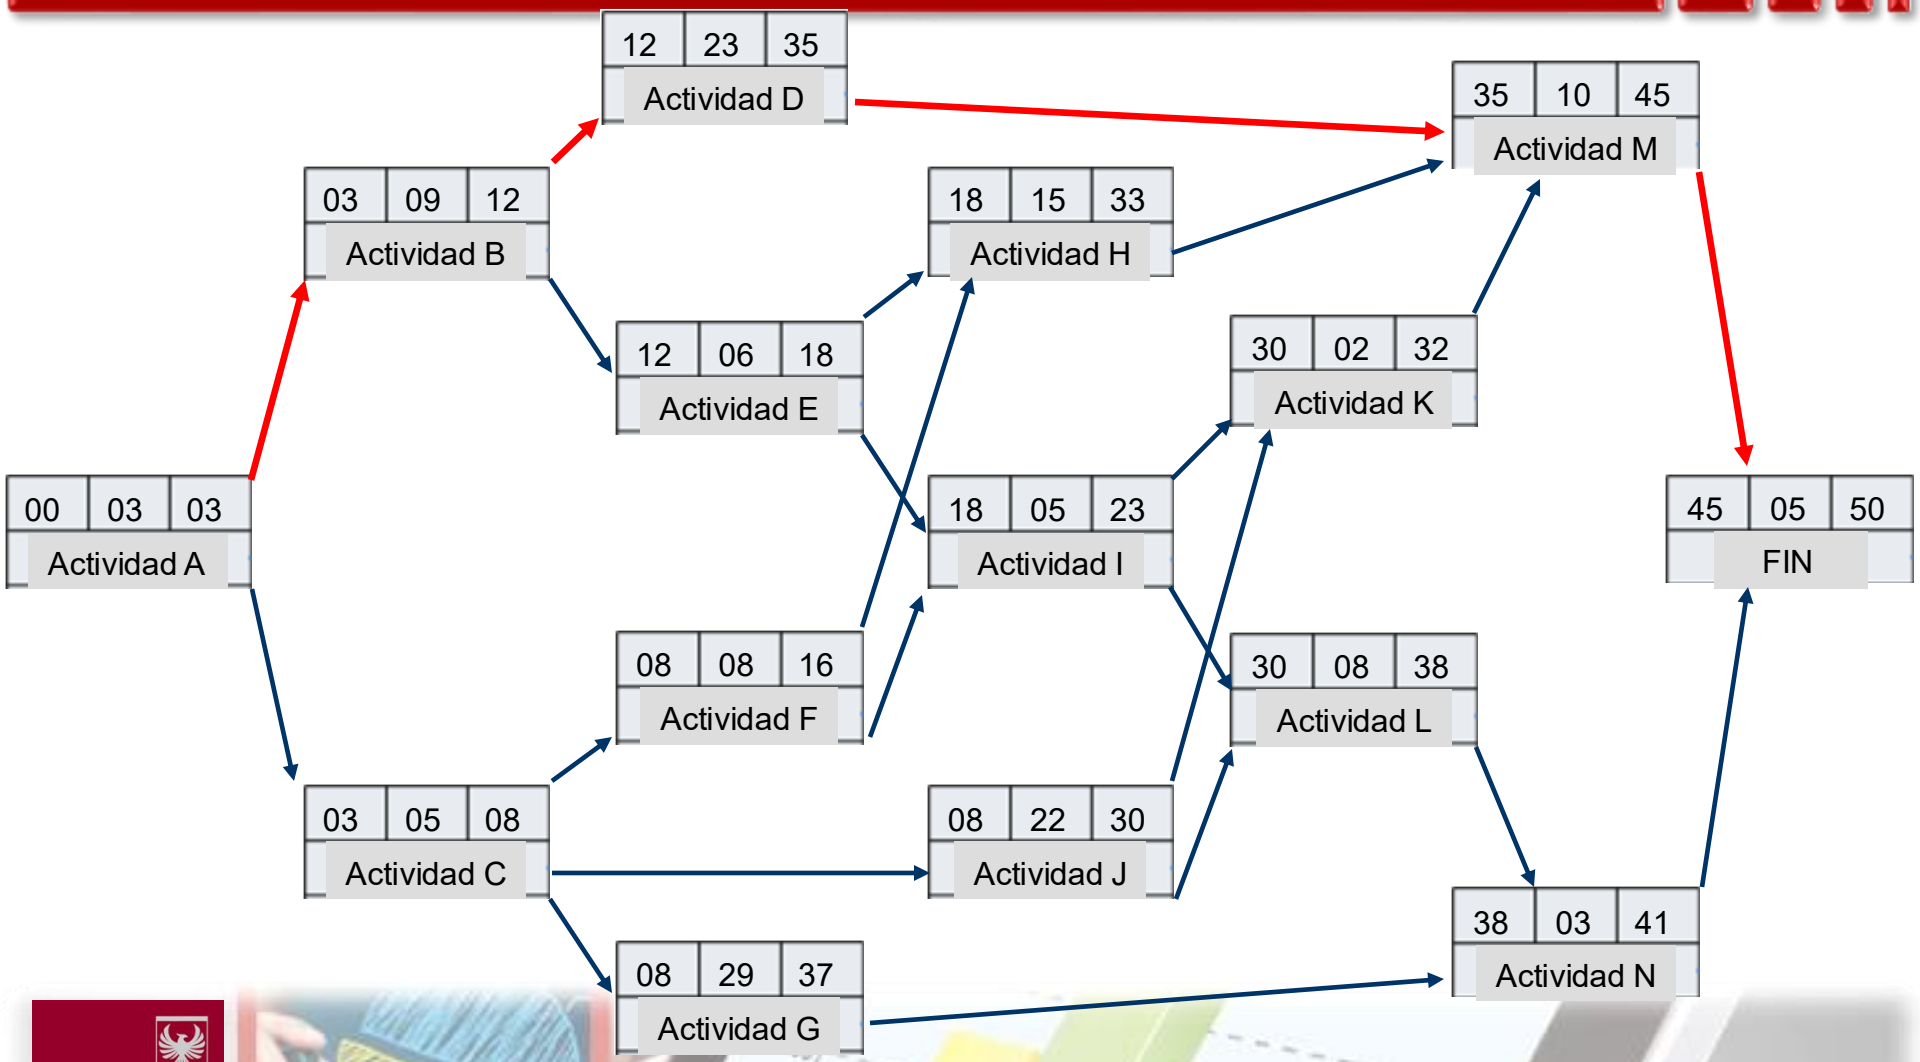

GANTT, OTRA FORMA DE DESARROLLO DE CRONOGRAMA

Bus Unit	Project	%	Start	Finish
Sales	**Mega Project A**	**3**	**13-Mar-00**	**13-Apr-01**
Sales	Project A.1	10	13-Mar-00	16-Jun-00
Sales	Project A.2		11-May-00	28-Jul-00
Sales	Project A.3		10-Jul-00	05-Jan-01
Sales	Project A.4		24-Jul-00	09-Mar-01
Sales	Project A.5	15	13-Mar-00	04-Aug-00
Sales	Project A.6		10-Jul-00	13-Apr-01
Sales	Deliver Mega-Project A		13-Apr-01	13-Apr-01
Finance	Project Alpha		27-Nov-00	28-Sep-01
Finance	Project Beta	10	10-Apr-00	04-Jan-01
Finance	Project Gamma		31-Jul-00	28-Jun-01
	Upgrade Windows 95	100	27-Dec-99	21-Apr-00
IT	**Windows 2000 Project**	**3**	**06-Mar-00**	**07-Dec-01**
IT	Investigate Windows 2000 (R&D)	50	06-Mar-00	28-Apr-00
IT	Windows 2000 Management Strategy (Develop)		24-Apr-00	21-Jul-00
IT	Windows 2000 Management Strategy (Implement)		24-Jul-00	20-Oct-00
IT	Windows 2000 Management Strategy (Test)		28-Aug-00	15-Dec-00
IT	**Windows 2000 Management Strategy (Deploy)**		**18-Dec-00**	**07-Dec-01**
IT	Windows 2000 Upgrade for Desktops		05-Feb-01	03-Oct-01
IT	Windows 2000 Upgrade for Laptops		13-Aug-01	07-Dec-01
IT	Windows 2000 Upgrade for Severs		18-Dec-00	23-Mar-01
IT	Windows 2000 Complete		07-Dec-01	07-Dec-01
Finance	**Mega Project B**	**3**	**21-Feb-00**	**24-Nov-00**
Finance	Project B.1	20	21-Feb-00	07-Apr-00
Finance	Project B.2		10-Apr-00	26-May-00
Finance	Project B.3		10-Apr-00	16-Jun-00
Finance	Project B.4		19-Jun-00	25-Aug-00
Finance	Project B.5		28-Aug-00	24-Nov-00
Finance	Deliver Mega-Project B		24-Nov-00	24-Nov-00
HR	**Payroll System Enhancements**	**28**	**01-Oct-99**	**04-Apr-01**
HR	Task A	80	01-Oct-99	17-Mar-00
HR	Task B	20	31-Jan-00	07-Apr-00
HR	Task C	100	22-Nov-99	14-Jan-00
HR	Task D	10	28-Feb-00	30-Jun-00
HR	**Task E**		**10-Jul-00**	**25-Aug-00**
HR	Task E.1		10-Jul-00	28-Jul-00
HR	Task E.2		31-Jul-00	11-Aug-00
HR	Task E.3		14-Aug-00	25-Aug-00
HR	Task F		25-Sep-00	08-Dec-00
HR	Task G		11-Dec-00	19-Jan-01
HR	Task H		18-Sep-00	04-Apr-01
HR	Upgrade Complete		04-Apr-01	04-Apr-01

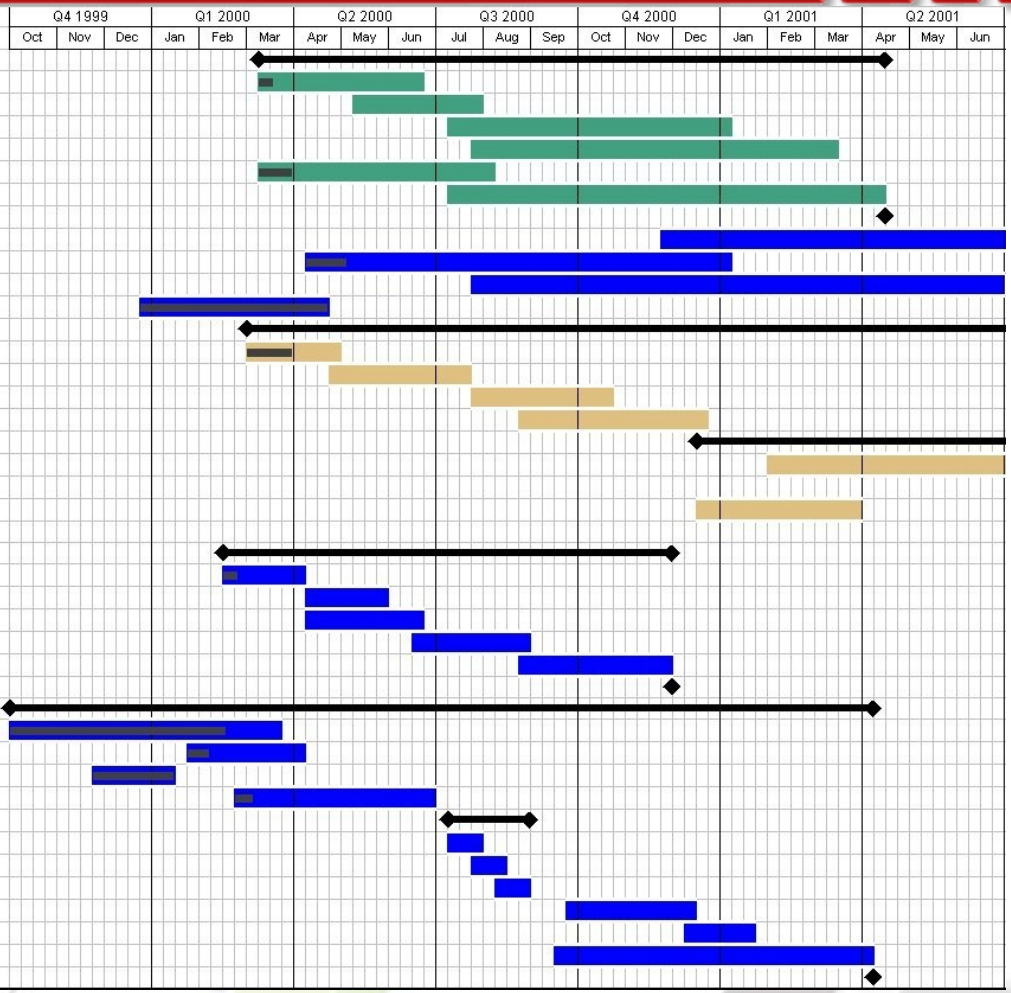

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

"Implica la determinación de los riesgos que pueden afectar al proyecto y la documentación de sus características"*







*Estas definiciones han sido extraídas del Glosario del Project Management Institute, *PMBOK® Guide*

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

Impacto							
El impacto compromete la supervivencia del proyecto	Alto	5	3,00	4,00	4,00	5,00	5,00
El impacto no puede ser manejado sólo con recursos propios	Moderado	4	3,00	3,00	4,00	4,00	5,00
El impacto es alto pero puede ser manejado con recursos propios	Medio	3	2,00	3,00	3,00	4,00	4,00
El impacto es leve y puede ser manejado con recursos propios	Bajo	2	2,00	2,00	3,00	3,00	4,00
No produce ningún tipo de impacto	Insignificante	1	1,00	2,00	2,00	3,00	3,00
			1	2	3	4	5
			Insignificante	Bajo	Medio	Moderado	Alto
			Extremadamente improbable que suceda	No ha sucedido pero podría suceder	Ha sucedido	Sucede ocasionalmente	Sucede regularmente

Probabilidad de ocurrencia


DEBATE - PLANIFICACIÓN DE LA RESPUESTA A LOS RIESGOS

¿Que acciones puedo tomar ante un riesgo negativo (amenaza)?



PLANIFICACIÓN DE LA RESPUESTA A LOS RIESGOS

Estrategias para Riesgos Negativos o Amenazas

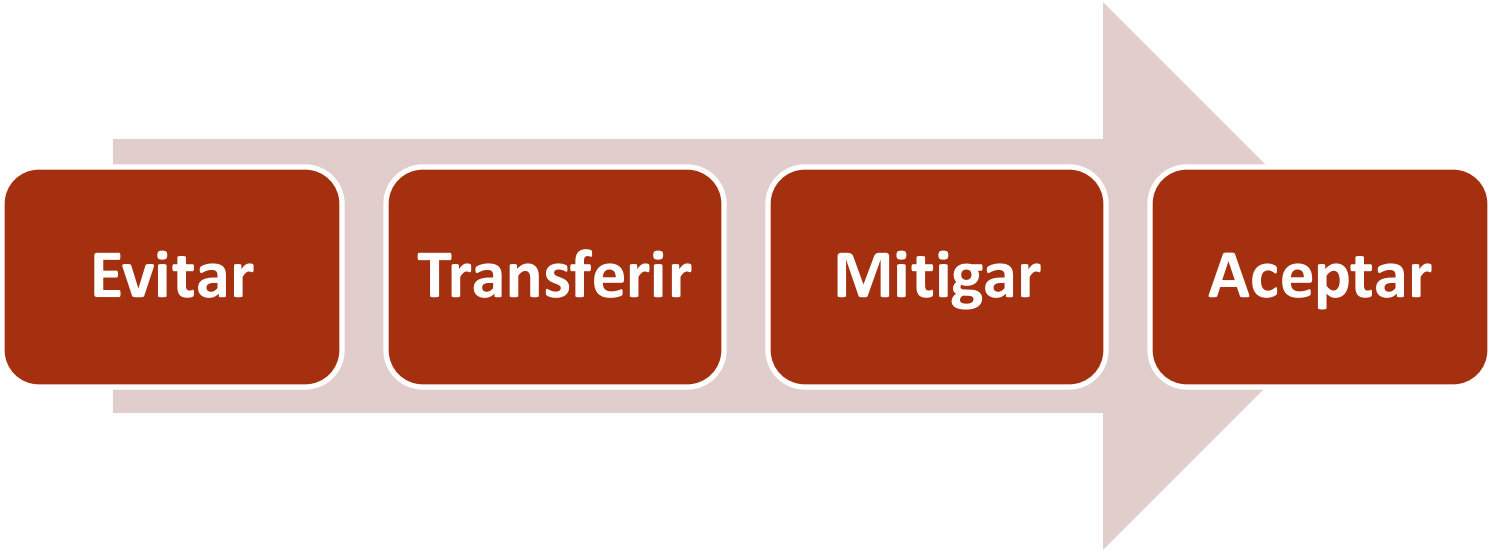

CIERRE DEL PROYECTO O FASE DEL PROYECTO

"Implica la finalización de todas las tareas comprendidas en el proyecto o en una de sus fases (el proceso se aplica siempre que se finaliza una), la transferencia de los entregables definidos y su verificación."*

Existen 2 procedimientos para establecer las interacciones necesarias a fin de poder ejecutar el cierre del proyecto:

- Cierre administrativo: actividades necesarias para recopilar registros del proyecto, analizar el éxito o fracaso, documentar lecciones aprendidas y archivar toda la información para su uso futuro.
- Cierre de contrato: actividades para cerrar cualquier contrato establecido para el proyecto



UNIVERSIDAD DEL CEMA UCEMA


**Estas definiciones han sido extraídas del Glosario del Project Management Institute, PMBOK® Guide*

PROCESOS DE CONTENCIÓN A LA METODOLOGÍA PROPUESTA



UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA


INTEGRACIÓN

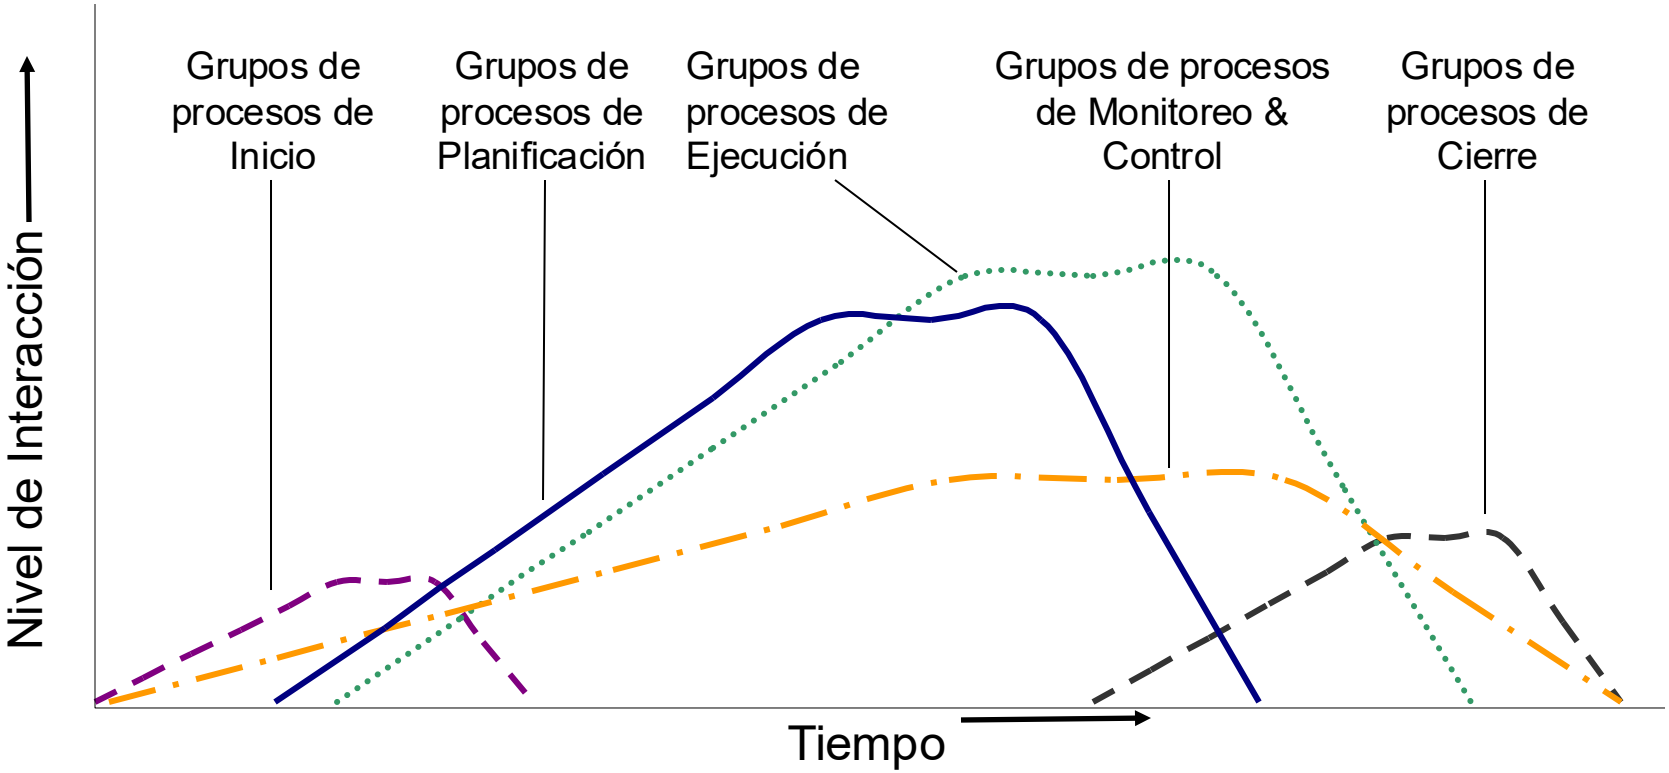

El de integración es un esfuerzo clave en el desempeño del proyecto debido a que su gestión no fluye de manera secuencial y constantemente se superponen situaciones que implican tomar decisiones que en muchos casos son excluyentes.


SEGUIMIENTO Y CONTROL PRINCIPALES MÉTRICAS

Alcance
(Enunciado de Alcance + EDT + Diccionario)




+

Tiempo
(Cronograma)




+

Costo
(Presupuesto)

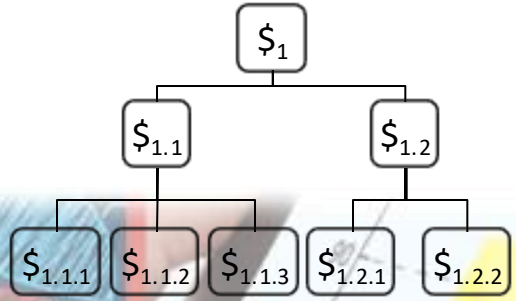

=

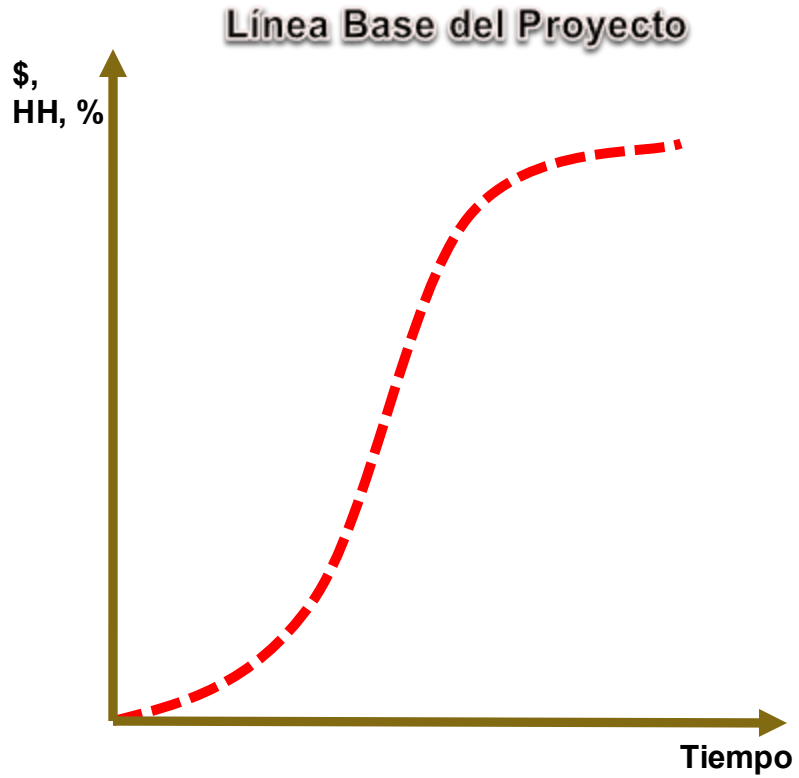

GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS



Asegurar la generación oportuna y adecuada, la recopilación, distribución, almacenamiento, consulta y disposición final de la información de Gestión

- Gestionar los vínculos críticos entre personas e información a fin de garantizar una comunicación exitosa
- ¿Quién necesita información?
- ¿Qué información necesita?
- ¿Cuándo la necesita?
- ¿Cómo se le suministrará?
- ¿Quién la suministrará?

HERRAMIENTA DE TRABAJO

GRILLA DE INTERESADOS Y REQUISITOS

Proyecto...

Interesado	Requisitos	Valoración de Poder	Valoración de Interés	Estrategia Potencial
Nombre y Apellido (Personas Físicas) Nombre Institucional (Personas Jurídicas)	Descripción de principales expectativas y requisitos exigidos al Proyecto por parte del Interesado	Alto/Medio/Bajo - Positivo/Neutro/Negativo	Alto/Medio/Bajo	Mecanismos tendientes a fomentar que se ejerzan influencias positivas y que no se ejerzan influencias negativas

Observaciones:

Se completa primero la columna de interesados. Una vez completada la misma se trabaja por fila detallando para cada interesado los requisitos, la valoración de impacto y la estrategia potencial.

CONTROL DE CAMBIOS | INTERESADOS Y REQUISITOS | ACTIVIDADES Y COSTO | EDT | RIESGOS | COMUNICACIONES

UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA
